

Global cars, a.s.

Digitální transformace

Úvodní studie

A. Executive summary

A.1) Zadání

Global cars a.s. je mladá a flexibilní společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti automobilového průmyslu (prodej, servis, půjčování osobních aut Hyundai). Firma Global cars vznikla před 2 roky akvizicí 6 různých autosalónů v ČR (Praha, Plzeň, Pardubice, Liberec, Tábor, Jihlava). Minulý rok došlo k rozšíření sítě provozoven o pobočky v Brně, Olomouci a Ostravě. Celá síť prodejen patří jednomu majiteli, jenž investoval svoje prostředky, které získal podnikáním na akciových trzích. Management společnosti sídlí na pražské pobočce a tvoří jej převážně členové rodiny majitele, tudíž společnost funguje na bázi rodinné firmy. Společnost se zaměřuje zejména na prodej a servis aut, přičemž půjčování aut je pouze doplňkovou aktivitou. Všechny pobočky fungují autonomně (mají rozdílné pracovní postupy, informační systémy a dodavatele). Vedení firmy i lokální management klade velký důraz na osobní jednání, přičemž každému zákazníkovi je věnována nadstandartní „osobní péče“. Díky této filozofii společnost trochu podcenila systémovou ICT podporu prodeje (webové stránky, CRM, rezervační systém, atd.), což se v době ekonomické stagnace začíná velice negativně projevovat na hospodaření společnosti.


Motivace společnosti Global cars a.s. pro realizaci projektu: Aktuálně nejsou jednotlivé pobočky informačně propojeny, ani procesně sjednoceny. Cílem projektu je tedy tyto nedostatky odstranit a přizpůsobit vlastní podnikání moderním trendům. Vedení společnosti očekává, že investované prostředky a čas se příznivě projeví na zlepšení ekonomické prosperity společnosti.

A.2) Vize

Základní vizí společnosti Global cars, a.s. je překonání dosavadní provozní roztržštěnosti devíti autonomních poboček, opuštění období ekonomické stagnace a vybudování jednotného, silného podniku. Firma se stane technologicky vyspělým lídrem na trhu, který plně využívá svůj obchodní potenciál a orientuje se na maximální zákaznickou spokojenost. Cílem je transformace do podoby organizace, kde je klientská péče standardizovaná na té nejvyšší úrovni, fronty na servis jsou minulostí díky preciznímu plánování kapacit a prodejní příležitosti jsou aktivně a včasně vytěžovány. Celá firma bude působit jako jeden sehraný celek, v němž vedení přijímá klíčová strategická rozhodnutí výhradně na základě reálných dat a transparentních výkonnostních metrik. Tato změna přinese nejen výrazné zvýšení obrátu a marží, ale také posílí loajalitu zaměstnanců, kterým

nové prostředí nabídne jasné a motivující pracovní podmínky se spravedlivým ohodnocením závislým na jejich skutečném výkonu.

Řešení je založeno na využití již existujícího informačního systému INS@ček společnosti Enterprise Solutions, který je v současné době instalován a provozován řádově u stovek firem v České a Slovenské republice. Svými funkcemi pokrývá aktuální požadavky Global cars a do budoucna je jednoduše rozšiřitelný o další. V rámci navrženého řešení systém bude pokrývat procesy autoprodeje, autoservisu a všechny důležité interní agendy provozu společnosti, které byly identifikované na jednáních se zástupci zákazníka. Nahrazením původních manuálních procesů a nejednotných lokálních aplikací vznikne komplexní, plynule fungující a plně centralizovaná platforma pro řízení všech klíčových firemních zdrojů, jejíž logické uspořádání je zjednodušeně znázorněné na **Obrázku 1**.

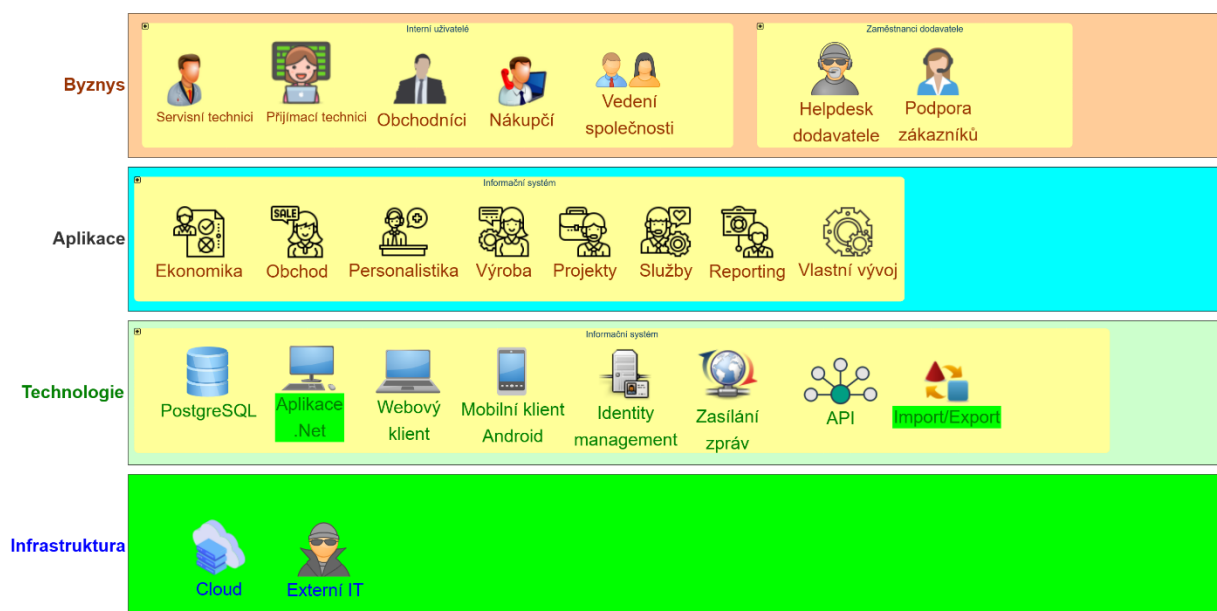

Obrázek 1. Obecná architektura systému společnosti Global Cars (moduly jádra zeleně)

A.3) Roadmapa

S ohledem na provozní specifika společnosti Global cars, a.s. je projekt rozdělen na hlavní realizační etapu a následné období podpory.

Harmonogram plně respektuje definovaná období „Blackouts“ (červenec, srpen a prosinec), kdy zákazník nemůže poskytovat součinnost.

- **Etapa 1 - Implementace informačního systému (červen 2026 - leden 2027)**


Tato klíčová etapa pokrývá celý životní cyklus zavedení systému od úvodní analýzy až po nasazení nového systému na všech 9 pobočkách.

- **Podpora (od 10. ledna 2027)**

Bezprostředně po nasazení následuje fáze zvýšené péče. V prvním týdnu provozu bude zajištěna fyzická přítomnost IT konzultantů dodavatele na každé z 9 poboček pro podporu zaměstnanců při rutinních operacích. Následně systém přechází do režimu standardní podpory dle smlouvy SLA s plánovanou životností řešení minimálně 5 let.

A.4) Harmonogram

Harmonogram byl navržen dle požadavku Global Cars na realizaci během jednoho roku v období, kdy bude možné ze strany Global Cars poskytnout dostatečnou součinnost. Za klíčový je považován termín (milník) dokončení implementace a finálního nasazení systému 10.1.2027. **Obrázek 2** zachycuje termíny jednotlivých kroků implementace, které byly definovány společností Enterprise Solutions.

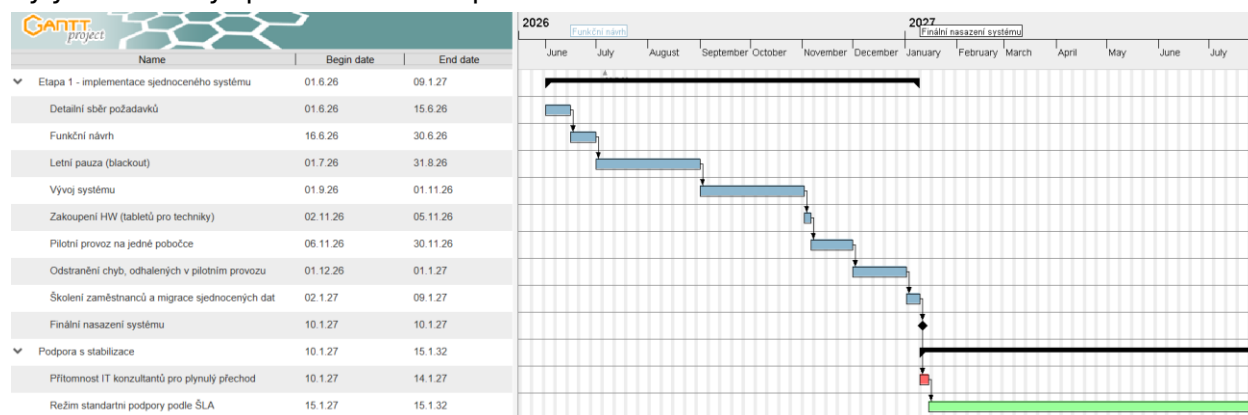

Obrázek 2. Celkový harmonogram projektu

A.5) Cena

Na základě společné dohody se zákazníkem proběhne celý cyklus implementace v jedné hlavní realizační etapě (Etapu 1), po které bude následovat fáze dlouhodobé podpory a údržby. Ceny (bez DPH) jsou počítány dle aktuálního ceníku prací dodavatele (Enterprise Solutions, s.r.o.), který je součástí příloh tohoto dokumentu. Zahrnuty jsou pouze náklady na pořízení informačního systému INS@ček, cloudovou infrastrukturu a s tím spojenou implementaci. Pořízení dodatečného hardwaru (např. mobilní tablety a PC pro pobočky) je na základě společné dohody v plné režii zákazníka (Global cars, a.s.). Maximální odchylka odhadu, s ohledem na definované požadavky a získané informace, je +/- 20 %.

- **Cena za licence: 1 390 000 Kč**
- **Cena implementačních prací (Etapu 1): 2 725 000 Kč**
- **Ostatní náklady instalace: 10 000 Kč**

Celková odhadovaná cena za pořízení a implementaci projektu činí celkem **4 125 000 Kč**.

Během reálného provozu systému je počítáno s následujícími pravidelnými platbami:

- **Maintenance poplatek ve výši 20 %** z celkové aktuální ceny licencí, účtovaný od druhého roku využívání systému. Pokud nedojde k navýšení licencí, činí tento poplatek **278 000 Kč ročně**.
- **Roční podpora systému ve výši 480 000 Kč ročně**. Tato hodnota je pouze orientační; její konkrétní parametry, rozsah služeb a finální cena budou předmětem detailní servisní smlouvy (SLA), která bude se Zákazníkem podepsána.

Návratnost investice (**ROI**) **pro období 5 let** provozu systému od ukončení implementace byla spočítána na **472 %**. Tento výpočet je podložen ročními finančními přírůsky a úsporami, které systém vygeneruje:

- **V prvním roce po spuštění (4 500 000 Kč):** Částka se skládá ze zvýšení obrátu a následně zisku autoprodeje o 10 % (2 400 000 Kč) a ze zvýšení efektivity autoservisu o 10 % (2 100 000 Kč).
- **Ve druhém až pátém roce po spuštění (9 800 000 Kč ročně):** Očekává se stabilní nárůst prodeje aut o 20 % (4 800 000 Kč) a efektivity autoservisu o 20 % (4 200 000 Kč) oproti původnímu stavu. K tomu se navíc přičítá úspora 800 000 Kč ročně za nenabírání nových zaměstnanců, jelikož systém umožní pokrýt zvýšenou poptávku se stávajícím personálem.

V horizontu 5 let a za těchto reálných předpokladů je implementace systému pro Global cars, a.s. **zisková**.

A.6) Součinnost

Pro úspěšnou realizaci projektu, která na základě dohody proběhne v rámci jedné realizační etapy (Etapa 1) a následné fáze zvýšené podpory, je celková personální náročnost jasně rozdělena mezi týmem dodavatele a týmem zákazníka:

- **Součinnost dodavatele (Enterprise Solutions, s.r.o.):** Celkové odhadované pracovní úsilí dodavatele činí **2 535 člh**. Tato kapacita se skládá z 1 683 člh alokovaných primárně na analýzu, vývoj a konfiguraci systémových modulů, a z 852 člh určených na další práce (projektové řízení, migrace dat, instalace, školení zaměstnanců společnosti zákazníka a především zvýšená fyzická podpora IT konzultantů na pobočkách v prvním týdnu ostrého provozu).
- **Součinnost zákazníka (Global cars, a.s.):** Ze strany zákazníka je vyžadována aktivní účast vybraných zaměstnanců (dedikovaný vedoucí projektu, členové vrcholového managementu v řídicí komisi, klíčoví i běžní uživatelé). Celková minimální požadovaná součinnost činí **1 795 člh**. Z této kapacity je největší část striktně vyhrazena na plošné školení všech zaměstnanců před nasazením do reálného provozu (1 200 člh), realizaci měsíčního pilotního provozu na vybrané pobočce (160 člh) a uživatelské testování (80 člh). Harmonogram projektu přitom plně respektuje nahlášená období obchodních špiček a dovolených (tzv. Blackouts v červenci, srpnu a prosinci), kdy zákazník nemůže tyto kapacity poskytovat.
- **Infrastrukturní součinnost (Global cars, a.s.):** Zákazník zajistí fyzickou připravenost prostředí pro nasazení systému. To obnáší garanci provozuschopnosti stávajících PC stanic a stabilního internetového připojení na všech 9 pobočkách. Dále zákazník ve vlastní režii a s předstihem zajistí nákup dodatečného hardwaru, zejména 10" tabletů s fotoaparátem pro servisní techniky, aby bylo možné naplno využívat funkcionality fotodokumentace při převzetí zakázek.

B. Obsah

A. Executive summary	2
A.1) Zadání	2
A.2) Vize	2
A.3) Roadmapa	4
A.4) Harmonogram	4
A.5) Cena	5
A.6) Součinnost	6
B. Obsah	7
C. Slovník	9
D. Přílohy.....	10
E. Zadání úvodní studie	11
E.1) Vstupní zadání	11
E.2) Záměr.....	11
E.3) Aktuální problémy (business problematika)	12
E.4) SWOT analýza Global cars, a.s.	13
F. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ.....	15
F.1) Klíčové požadavky na provoz systému.....	15
F.2) Technologická a jiná omezení.....	15
F.3) FURPS+ analýza informačního systému Global cars	16
G. BUDOUCÍ STAV	18
G.1) Vize řešení.....	18
G.2) Strategie naplnění vize řešení	19
G.3) Přínosy navrženého řešení.....	21
G.4) Rizika navrženého řešení	23
H. Roadmapa projektu	28
H.1) Projektový tým	28
H.2) Součinnosti	29

H.3) Etapa 1.....	30
H.4) Vize dalšího rozvoje systému	32
H.6) Podpora systému po nasazení	33
H.7) Projektová rizika	34
I. Finance	38
J. ZÁVĚR	41

C. Slovník

Zkratka	Popis změn
AS-IS	Současný (výchozí) stav procesů a systémů ve společnosti před implementací nového řešení.
Big Bang	Strategie jednorázového spuštění nového informačního systému do ostrého provozu současně na všech 9 pobočkách (naplánováno na leden 2027).
CRM	Customer Relationship Management- informační systém pro řízení vztahů se zákazníky, evidenci klientské historie a podporu prodeje.
Paralelní provoz	Fáze testování, při které se jeden měsíc účtují transakce souběžně ve starém i novém systému na jedné vybrané pobočce pro ověření správnosti dat a uzávěrek.
Read-only instance	Původní informační systém (historické reziduum), který po spuštění nového řešení zůstane na pobočkách pouze pro čtení (pro dohledávání starých záruk), čímž se radikálně zjednoduší datová migrace.
SLA	Service Level Agreement- smlouva o úrovni poskytovaných IT služeb a podpory. Využívá se, jelikož zákazník do budoucna nepočítá s vlastním IT oddělením.
SWOT analýza	Analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek spolu s příležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats).
TO-BE	Cílový (budoucí) stav procesů a systémů po úspěšné implementaci navrženého řešení.
SaaS	Software as a Service (Software jako služba) – Model distribuce softwaru, kde je systém hostován a provozován poskytovatelem v cloudu. Zákazník k němu přistupuje přes internet a platí za jeho užívání, čímž odpadá nutnost instalace a údržby na vlastních lokálních serverech.
GDPR	General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Soubor přísných evropských pravidel pro bezpečné shromažďování, uchovávání a zpracování osobních dat klientů i zaměstnanců (klíčové pro návrh CRM modulu).
ICT	Information and Communication Technologies – Informační a komunikační technologie. Souhrnný pojem zahrnující veškerý hardware, software, počítačové sítě a komunikační prostředky nutné pro digitální chod společnosti.
UAT	User Acceptance Testing – Uživatelské akceptační testování. Závěrečná fáze testování, během které vybraní zaměstnanci zákazníka zkoušejí práci v novém systému a ověřují, zda řešení v praxi splňuje předem dohodnuté požadavky.

API	Application Programming Interface – Rozhraní pro programování aplikací. Slouží jako komunikační most, který umožňuje bezpečnou a automatizovanou výměnu dat mezi dvěma zcela odlišnými systémy (např. napojení vašeho systému na externího dodavatele náhradních dílů).
KPI	Key Performance Indicator – Klíčový ukazatel výkonnosti. Měřitelná metrika sloužící k vyhodnocení toho, jak dobře společnost, pobočka nebo konkrétní zaměstnanec plní stanovené cíle (např. vytíženost mechanika jako podklad pro výpočet mzdy).
B2B	Business-to-Business – Obchodní vztah probíhající výhradně mezi dvěma společnostmi. V kontextu projektu jde například o prodej a servis firemních vozových flotil (tyto nákupy mají jiná pravidla, např. čekají na schválení ročních firemních rozpočtů).
B2C	Business-to-Consumer – Obchodní vztah zaměřený přímo na koncového spotřebitele. Jde o běžného zákazníka (fyzickou osobu), který si kupuje vůz nebo objednává servis pro osobní, nikoliv firemní účely.
Blackouts	Kritická období, kdy nebude poskytována součinnost z důvodu nedostatku kapacit

D. Přílohy

D.1) Licenční model, ceny prací



0730-CENIK-AUTA-20
26-05-07.xlsx

D.2) Harmonogram projektu ve formátu PNG



harmonogram.png

D.3) Harmonogram projektu ve formátu GAN

D.4) Architektura systému v diagramech z editoru yEd



common_architecture
.png



common_architecture
.graphml



module_architecture.
png



module_architecture.
graphml

E. Zadání úvodní studie

E.1) Vstupní zadání

Global cars a.s. je mladá a flexibilní společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti automobilového průmyslu (prodej, servis, půjčování osobních aut Hyundai). Firma Global cars vznikla před 2 roky akvizicí 6 různých autosalónů v ČR (Praha, Plzeň, Pardubice, Liberec, Tábor, Jihlava). Minulý rok došlo k rozšíření sítě provozoven o pobočky v Brně, Olomouci a Ostravě. Celá síť prodejen patří jednomu majiteli, jenž investoval svoje prostředky, které získal podnikáním na akciových trzích. Management společnosti sídlí na pražské pobočce a tvoří jej převážně členové rodiny majitele, tudíž společnost funguje na bázi rodinné firmy. Společnost se zaměřuje zejména na prodej a servis aut, přičemž půjčování aut je pouze doplňkovou aktivitou. Všechny pobočky fungují autonomně (mají rozdílné pracovní postupy, informační systémy a dodavatele). Vedení firmy i lokální management klade velký důraz na osobní jednání, přičemž každému zákazníkovi je věnována nadstandartní „osobní péče“. Díky této filozofii společnost trochu podcenila systémovou ICT podporu prodeje (webové stránky, CRM, rezervační systém, atd.), což se v době ekonomické stagnace začíná velice negativně projevovat na hospodaření společnosti.

Motivace společnosti Global cars a.s. pro realizaci projektu: Aktuálně nejsou jednotlivé pobočky informačně propojeny, ani procesně sjednoceny. Cílem projektu je tedy tyto nedostatky odstranit a přizpůsobit vlastní podnikání moderním trendům. Vedení společnosti očekává, že investované prostředky a čas se příznivě projeví na zlepšení ekonomické prosperity společnosti.

E.2) Záměr

Hlavním záměrem projektu je překonat současnou ekonomickou stagnaci společnosti Global cars, a.s. a radikálně zefektivnit její interní procesy. Zásadní překážkou růstu je dnes absence standardizovaných postupů napříč devíti pobočkami, což způsobuje zbytečné ztráty v obou klíčových divizích. Cílem je proto nasadit centrální informační systém, který odstraní neefektivní rutiny, sjednotí pracovní workflow v celé síti a vyřeší konkrétní procesní problémy, které firmu aktuálně brzdí.

V oblasti obchodu je konkrétním záměrem využít sdílený CRM modul k aktivnímu vytěžování dat. Obchodníci uvidí kompletní historii zákazníků napříč celou republikou, budou moci sledovat specifické potřeby a rozpočtové cykly B2B klientů, a předejdou tak

jejich odchodu ke konkurenci. V oblasti autoservisu je cílem odstranit fronty a prostoje. Nový systém zavede přesné plánování kapacit techniků, pracovišť i náhradních dílů, od čehož se očekává skokové zvýšení užitečné využitelnosti servisu o 20 %.

Dalším klíčovým záměrem je získat spolehlivý nástroj pro strategické řízení celé společnosti. Sjednocení dat poskytne managementu v reálném čase přesné přehledy o hospodaření a výkonnosti všech devíti poboček i konkrétních pracovníků. To umožní opustit současný plošný model odměňování a zavést spravedlivý mzdový systém, který bude přímo navázán na reálná data a splněná KPI. Všechny tyto kroky směřují k jedinému konečnému cíli: naplno využít obchodní potenciál společnosti, zvýšit komfort pro zákazníky a začít stabilně generovat finanční zisk.

E.3) Aktuální problémy (business problematika)

Problémy, které jsou z pohledu řešení zásadní a které mají vliv na stávající i budoucí fungování Global cars, a.s.:

- **Ekonomika a personál:** Společnost operuje na hraně „kladné nuly“, takže jí chybí rozpočet na inovace a adekvátní mzdy. Zaměstnanci jsou navíc demotivováni z důvodu plošného odměňování, které nezohledňuje jejich individuální výkon.
- **Procesní roztříštěnost:** Každá z devíti poboček funguje jako samostatná jednotka s vlastními pracovními postupy. Chybí jednotné standardy a pravidla, což vedení znemožňuje firmu efektivně kontrolovat a řídit jako jeden sehraný celek.
- **Neefektivní servis a nákup:** Užitečná využitelnost zaměstnanců a pracovišť autoservisu se pohybuje pouze kolem 70 %, a přesto zákazníci zbytečně čekají ve frontách. Firma také přichází o množstevní slevy kvůli vysoké diverzitě v nákupu náhradních dílů na jednotlivých pobočkách.
- **Slepá místa v obchodu:** Důležité informace o zákaznících se evidují špatně, což znemožňuje jakoukoliv pokročilou analytiku (Business Intelligence). Obchodníci i technici jsou pak na schůzky špatně připraveni a firma přichází o potenciální zisk.
- **Technologické zaostávání:** Celou síť trápí absence digitalizace a naprostá roztříštěnost informačních systémů. Pobočky si mezi sebou neumí efektivně předávat data.

E.4) SWOT analýza Global cars, a.s.

Všechny klíčové vlastnosti Global cars, a.s., s ohledem na zadání a nově zjištěné finanční a provozní skutečnosti, přehledně shrnuje Tabulka 1 v podobě SWOT analýzy.

Strengths (silné stránky)	• Silné tržní postavení a pokrytí prostřednictvím sítě 9 poboček v ČR. • Stabilní a vysoký kumulativní roční obrat dosahující 370 milionů Kč. • Poskytování komplexních služeb pod jednou střechou (prodej, servis, půjčovna vozů). • Pevné obchodní vztahy se zákazníky na základě osobního / rodinného přístupu.
Weaknesses (slabé stránky)	• Demotivace zaměstnanců z důvodu absence objektivního motivačního systému a plošného odměňování nezávislého na výkonu. • Vysoká diverzita v nákupu náhradních dílů znemožňuje výhodné nákupní podmínky u jednotlivých dodavatelů. • Nízká užitečná vytíženost zaměstnanců a pracovišť autoservisu (kolem 70 %). • Zákazníci musejí zbytečně čekat ve frontách před autoservisem. • Špatná připravenost na návštěvy jednotlivých zákazníků u autoprodeje a autoservisu. • Důležité obchodní informace o jednotlivých zákaznících jsou špatně evidované. • Není business intelligence směrem k zákazníkům. • Absence digitalizace. • Provozování byznysu na úrovni "kladné nuly" s minimálním rozpočtem na inovace a mzdy. • Informační systémy jednotlivých poboček jsou roztříštěné.

Opportunities (příležitosti)	• Získání většího tržního podílu na úkor technologicky zaostalejší konkurence. • Získání výhodnějších nákupních cen a podmínek u dodavatelů náhradních dílů. • Přetažení kvalitních a zkušených zaměstnanců (obchodníků, techniků) a jejich kontaktů od konkurence díky zavedení nového, transparentního a spravedlivého systému odměňování a uvolnění prostředků pro zvýšení mzdy zaměstnanců.
Threats (hrozby)	• Odchod klíčových zaměstnanců z důvodu chybějící motivace a neexistence odměňovacího systému. • Úbytek stávajících zákazníků a pokles akvizice nových klientů kvůli nízké kvalitě poskytovaných služeb. • Ztráta tržního podílu a porážka od silnějších, dynamicky se rozvíjejících konkurentů na trhu autosalonů (jako důsledek výše uvedených faktorů).

Tabulka 1. SWOT analýza.

Zvolená strategie: MIN-MAX

Stávající slabé stránky společnosti jsou kritické a přímo ohrožují její rentabilitu. Navržené řešení se proto soustředí na jejich neprodlenou eliminaci, čímž se otevírají srovnatelně významné perspektivy pro zásadní zlepšení pozice na trhu. Strategie **MIN-MAX** tak mění vnitřní krizi v přímou příležitost pro agresivní růst a ovládnutí tržního podílu na úkor konkurence.

F. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ

F.1) Klíčové požadavky na provoz systému

Vzhledem k tomu, že cílem projektu je komplexní digitalizace a sjednocení procesů napříč 9 autonomními pobočkami Global cars, a.s., byly identifikovány následující požadavky na provoz řešení:

- Zákazník nedisponuje rozsáhlým centrálním IT oddělením pro vývoj a správu složitých architektur. Z toho důvodu je navrhované řešení koncipováno jako cloudová služba (SaaS), jejíž plynulý běh a údržbu infrastruktury zajišťuje dodavatel (Enterprise Solutions, s.r.o.) a juniorní IT pracovník na každé pobočce.
- Dodatečný hardware nutný pro obsluhu systému na pobočkách bude pořízen přímo společnostmi Global cars.
- IT podpora a garance běhu systému, včetně odstraňování chyb, bude smluvně zajištěna formou SLA ze strany dodavatele.
- Zákazník se zavazuje zajistit stabilní internetové připojení na všech 9 pobočkách a vybavit zaměstnance odpovídajícím hardwarem.

F.2) Technologická a jiná omezení

Podrobnější technologické požadavky a omezení na tvorbu a provoz systému byly po diskusích se zákazníkem stanoveny následovně:

- Pro běh webového klienta (back-office) postačí stávající stacionární PC stanice zaměstnanců (požadavek na procesory AMD/Intel a min. 16 GB RAM).
- Servisní technici v servisu musí být nově vybaveni mobilními zařízeními (ideálně 10" tablety z Android 15 a výš) z důvodu nutnosti okamžité fotodokumentace vozidel.
- Informační obrazovky v zákaznických zónách (lobby) na pobočkách musí umět zobrazovat webové rozhraní pro anonymizované sledování postupu opravy v reálném čase.
- Architektura nesmí spoléhat na technologickou připravenost lokálních dodavatelů náhradních dílů. V případě absence API na straně dodavatele musí systém umět vygenerovat objednávku do formátu PDF a automaticky ji odeslat e-mailem.

F.3) FURPS+ analýza informačního systému Global cars

a) Funkční

- Jednotný modul CRM: strukturovaná evidence B2B a B2C zákazníků, klientské historie nákupů a oprav. Sledování nákupních zvyklostí a technických preferencí.
- Online rezervační systém autoservisu: evidence času, zdrojů a techniků. Systém nesmí obsahovat skryté časové rezervy, kapacity musí být plánovány přesně.
- Integrace věrnostního programu: automatické přidělování slev (např. 10% na díly, 5 % na servisní úkony) vázané na klientský profil.
- Digitalizace příjmu do servisu: nahrávání a ukládání fotodokumentace závad přímo z mobilních zařízení ve vyplňovací formulář.
- Modulární reporting a KPI: systém musí být dynamický a parametrizovatelný, aby lokální management mohl tvořit vlastní sestavy (SQL dotazy) a flexibilně upravovat pravidla pro výpočet odměn bez zásahů do zdrojového kódu.
- Automatizované notifikace (alerty) pro prodejce (např. upozornění na blížící se nákup aut klientem).

b) Použitelnost

- Plně responzivní design uživatelského rozhraní podporující nejnovější verze běžných webových prohlížečů (Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera).
- Oddělená prezentační a samoobslužná vrstva pro zákazníky (rezervace servisu a půjčovny).
- Uživatelské rozhraní pro zaměstnance musí být koncipováno s ohledem na minimalizaci administrativní zátěže (předvyplněné šablony, logický flow), avšak jeho reálné využívání bude zákazníkem vynucováno direktivně.

c) Spolehlivost

- Garantovaná dostupnost systému* (SLA) **99,8 %** v běžné pracovní době (8:00–18:00) a 99,5 % mimo pracovní dobu (pro samoobslužné rezervace klientů).
* Uvedeno bez započtení plánovaných nočních údržb.
- Automatizované zálohování sjednocené databáze klientů a zamezení ztráty klientské historie napříč 9 pobočkami.

d) Výkon

- Systém musí plynule obsloužit maximální souběžnou zátěž (concurrent users) 40 aktivních interních uživatelů napříč pobočkami.
- Souběžná zátěž v řádu nižších desítek uživatelů na externích zákaznických portálech v reálném čase.
- Doba odezvy pro složité vyhledávací dotazy v interní síti (např. filtrace v CRM nebo generování reportů) nesmí překročit 2 vteřiny.

e) Podporovatelnost

- Uzavření standardní servisní smlouvy (SLA) pokrývající režim 24/7. Přesná reakční doba (nástup na řešení) i garantovaná doba pro odstranění závady (resolution time) u kritických i běžných chyb systému budou detailně specifikovány a nastaveny až v samotné servisní smlouvě.
- Kompletní zdokumentování systému (administrátorská a uživatelská dokumentace).
- Poskytnutí součinnosti a fyzické přítomnosti dodavatele na pobočkách během úvodní fáze roll-outu.

f) Další nefunkční požadavky

- Systém musí splňovat nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vzhledem ke zpracování klientských dat.
- Striktní správa přístupů a uživatelských oprávnění na základě rolí (např. management, prodejce, nákupčí, přijímací technik).

G. BUDOUCÍ STAV

G.1) Vize řešení

Základní vizí společnosti Global cars, a.s. je překonání dosavadní provozní roztržštěnosti devíti autonomních poboček, opuštění období ekonomické stagnace a vybudování jednotného, silného podniku. Firma se stane technologicky vyspělým lídrem na trhu, který plně využívá svůj obchodní potenciál a orientuje se na maximální zákaznickou spokojenost. Cílem je transformace do podoby organizace, kde je klientská péče standardizovaná na té nejvyšší úrovni, fronty na servis jsou minulostí díky preciznímu plánování kapacit a prodejní příležitosti jsou aktivně a včasně vytěžovány. Celá firma bude působit jako jeden sehraný celek, v němž vedení přijímá klíčová strategická rozhodnutí výhradně na základě reálných dat a transparentních výkonnostních metrik. Tato změna přinese nejen výrazné zvýšení obrátu a marží, ale také posílí loajalitu zaměstnanců, kterým nové prostředí nabídne jasné a motivující pracovní podmínky se spravedlivým ohodnocením závislým na jejich skutečném výkonu.

Řešení je založeno na využití již existujícího informačního systému INS@ček společnosti Enterprise Solutions, který je v současné době instalován a provozován řádově u stovek firem v České a Slovenské republice. Svými funkcemi pokrývá aktuální požadavky Global cars a do budoucna je jednoduše rozšiřitelný o další. V rámci navrženého řešení systém bude pokrývat procesy autoprodeje, autoservisu a všechny důležité interní agendy provozu společnosti, které byly identifikované na jednáních se zástupci zákazníka. Nahrazením původních manuálních procesů a nejednotných lokálních aplikací vznikne komplexní a plně centralizovaná platforma, jejíž přínos v reálném provozu ilustrují následující oblasti:

Informační sjednocení

Nové ICT technologie informačně sjednotily všech 9 poboček prostřednictvím centrálně sdílené databáze. Díky této integraci jsou veškeré procesy standardizovány a relevantní informace jsou dostupné v reálném čase napříč všemi pobočkami.

Standardizovaný prodej a CRM

Obchodník na pobočce v Ostravě se připravuje na schůzku s B2B klientem. V systému okamžitě vidí kompletní historii klienta, včetně servisních zásahů provedených v Praze, a díky evidenci rozpočtových cyklů oslovuje firmu s nabídkou přesně v okamžiku, kdy firma plánuje nákup nových vozů. Zákazník má k dispozici online konfigurátor, jehož výstupy má prodejce předem k dispozici, což zkracuje dobu jednání a zvyšuje šanci na úspěšný prodej.

Moderní a transparentní servis

Při příjezdu zákazníka do servisu přebírá technik vůz s tabletem v ruce. Na základě VIN kódu systém automaticky identifikuje vůz a technickou specifikaci. Technik provádí fotodokumentaci exteriéru, která se ihned páruje k zakázce. Tím eliminujeme spory o skryté vady.

Efektivní plánování

Manažer pobočky již nemusí bojovat s frontami nebo prostoji u servisu sám. Rezervační systém mu poskytne všechny potřebné informace pro lepší plánování kapacit (např. dostupnost techniků a náhradních dílů).

Strategické řízení založené na datech

Vedení společnosti může na pár kliknutí porovnat výkonnost jednotlivých poboček, sledovat spokojenost zákazníků z dotazníků nebo automaticky vypočítat variabilní složku mzdy zaměstnanců na základě jejich reálného výkonu a KPI.

G.2) Strategie naplnění vize řešení

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, základem navrhovaného řešení je plné využití existujícího informačního systému INS@ček od společnosti Enterprise Solutions. Technologicky je systém koncipován jako moderní cloudová služba (SaaS). Tento přístup plně reflektuje strategický požadavek společnosti Global cars, a.s. zbavit se interní správy IT a přenechat technologickou údržbu profesionálům. Systém je postaven na moderních a ověřených technologiích (databáze PostgreSQL, aplikační vrstva .NET), což zaručuje vysokou stabilitu, bezpečnost dat (v souladu s GDPR a požadavky na datacentra v EU) a otevřenost pro budoucí integrace (např. využití API pro napojení na systémy dodavatelů náhradních dílů).


Obecnou technologickou a aplikační architekturu řešení zobrazuje následující **Obrázek 3**.



Obrázek 3. Obecná architektura systému společnosti Global Cars (moduly jádra zeleně)

Z obrázku a navržené strategie vyplývá, že kompletní infrastruktura a provoz systému budou plně pod správou externího dodavatele (Enterprise Solutions, s.r.o.), který garantuje dostupnost a podle přísné servisní smlouvy (SLA) v režimu 24/7. Uživatelé na pobočkách pro přístup do systému nebudou potřebovat žádné složité lokální instalace. Back-office zaměstnanci (prodejci, manažeři) využijí responzivního webového klienta na stávajících PC stanicích, zatímco technici v servisu budou pracovat s optimalizovaným mobilním klientem na dotykových tabletech (s OS Android 15).

Po funkční stránce strategie spoléhá na maximální vytěžení již existujících a praxí prověřených modulů systému INS@ček. Není tedy nutný zdoluhavý a rizikový vývoj celého softwaru "na zelené louce", moduly budou pouze parametrizovány na míru procesům Global cars. Detailní rozpad využívaných funkčních modulů ukazuje následující **Obrázek 4**. Podrobnější seznam a popis všech modulů lze nalézt v příloze tohoto dokumentu.

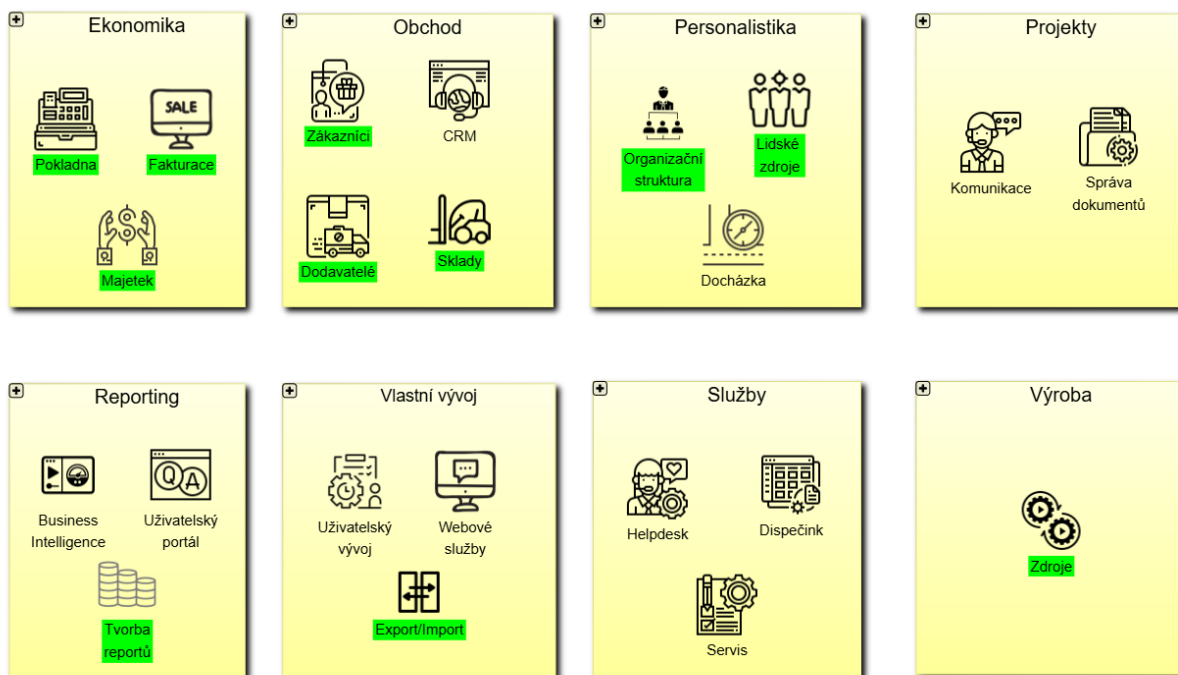

Obrázek 4. Funkční architektura systému společnosti Global Cars (moduly jádra zeleně)

G.3) Přínosy navrženého řešení

Klíčové benefity navrhovaného řešení pro business

- **Zvýšení efektivity:** Díky přesnému plánování kapacit (technici, pracoviště, díly) se očekává zvýšení užitečné vytiženosti servisních pracovišť o 20 % v horizontu dvou let.
- **Sjednocení procesů a dat:** Informační sjednocení 9 poboček zajistí, že data o zákaznících a historii vozů budou dostupná v reálném čase kdekoli v síti, což eliminuje duplicity a chyby
- **Zvýšení prodejního výkonu:** CRM modul umožní obchodníkům sledovat specifické potřeby zákazníků, jako jsou měsíce schvalování firemních rozpočtů u B2B klientů. Tím se předejde odchodu zákazníků ke konkurenci.
- **Zlepšení zákaznické zkušenosti:** Zavedení online konfigurátoru, rezervačního systému a informačních obrazovek v lobby zvýší transparentnost a komfort pro klienty.

- **Standardizace procesů napříč všemi divizemi:** Implementace centrální platformy zajistí pevný rámec pro procesy autoprodeje, autoservisu a všech důležitých interních agend provozu společnosti. Odstraní se tak rozdíly v postupech mezi pobočkami a nastaví se shodná pravidla, díky kterým bude celá síť fungovat podle jednoho optimalizovaného standardu.

Podpora managementu Global cars

Management společnosti získá nástroj pro efektivní řízení a strategické rozhodování založené na tvrdých datech, nikoli na odhadech.

Mezi hlavní přínosy patří:

- **Konsolidovaný reporting:** Okamžitý přehled o prodejních výsledcích a výkonnosti všech poboček bez nutnosti manuálního zpracování fyzických záznamů.
- **Objektivní systém odměňování:** Systém umožní automaticky vypočítávat variabilní složku mzdy na základě reálného KPI, jako je počet zakázek nebo spokojenost zákazníků z dotazníků.
- **Flexibilita a modularita:** Management může v systému samostatně měnit parametry u reportů podle aktuálních potřeb trhu bez nutnosti zásahu do kódu.
- **Monitoring incidentů:** Evidence negativních incidentů umožní vedení včas identifikovat problematické procesy a přijmout nápravná opatření.

Klíčové benefity navrhovaného řešení pro IT a provoz

- **Automatizace administrativy:** Systém automatizuje rutinní úkony, jako je generování objednávek náhradních dílů v PDF nebo zasílání CRM alertů pro oslovení klientů.
- **Standardizace dat:** Zavedení pevných polí v CRM namísto volného textu zajistí vysokou kvalitu a použitelnost dat pro budoucí analýzu.

G.4) Rizika navrženého řešení

Zákaznickovy problémy s procesní roztržitostí a využíváním kapacit servisu jsou téměř vždy provázeny riziky, která mohou nastat. Implementace nového centrálního informačního systému vybraná rizika eliminuje, ale na druhou stranu přináší nová. Společně jsme identifikovali následující rizika současného i budoucího stavu. Tato rizika je doporučeno při závěrečném hodnocení vzít jako další parametr rozhodovacího procesu.

Poznámka: Hodnoty pravděpodobnosti vycházejí ze zkušenosti dodavatele studie z podobně fungujících společností v automotive sektoru a z diskuse se zákazníkem.

Uvádíme tabulku číselných hodnot pravděpodobnosti nastání rizik pro tuto kapitolu:

Nulová	0 % až 0.99 %
Nízká	1 % až 14.99 %
Střední	15 % až 44.99 %
Vysoká	45 % až 100 %

RZ01 – Nízká efektivita a finanční stagnace (Současný stav)

Stav:	Nastalo
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global Cars
Pravděpodobnost výskytu:	Vysoká
Dopad	• Nevyužitá kapacita autoservisu (aktuální efektivita pouze na 70 %). • Společnost operuje na hraně rentability („kladná nula“). • Nemožnost adekvátně finančně odměňovat klíčové zaměstnance (hrozba jejich odchodu ke konkurenci). • Ztráta potenciálních B2B zakázek z důvodu nejednotné klientské historie.
Plán pro mitigaci rizika	• Průběžná snaha lokálních manažerů o manuální vytěžování dat. • Motivace stávajících zaměstnanců nefinančními benefity.
Krizový plán	• Urychlené nasazení nového CRM a rezervačního systému (řešeno tímto projektem) pro skokové zvýšení prodeje o 10 % a servisu o 20 %.

RZ02 – Neochota a rezistence zaměstnanců k novému systému

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global Cars
Pravděpodobnost výskytu:	Střední
Dopad	- Nízká kvalita dat v novém CRM modulu (zaměstnanci se vrátí k textovým souborům). - Zmaření investice do digitalizace a nedosažení slibovaného ROI. - Pokles prodejů v prvních měsících po nasazení (tzv. uživatelská paralýza).
Plán pro mitigaci rizika	- Jasně deklarovaný autokratický přístup vedení k vynucování evidence dat. - Kvalitní dvoufázové školení a fyzická přítomnost IT konzultantů na všech 9 pobočkách v prvním týdnu ostrého provozu. - Navázání mzdových bonusů a KPI přímo na správné využívání systému.
Krizový plán	Striktní uplatnění personálních kroků – výměna a nahrazení těch zaměstnanců, kteří se novému systému nepřizpůsobí.

RZ03 – Nedostupnost cloudového řešení po nasazení

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový manažer ze strany Enterprise Solutions → Systémový analytik ze strany Enterprise Solutions
Pravděpodobnost výskytu:	Nízká
Dopad	- Nedostupnost informací o rezervacích a klientské historii napříč všemi 9 pobočkami. - Neschopnost přijímat vozidla do servisu (způsobí fronty na pobočkách). - Zhoršení pověsti společnosti a ztráta zákazníků.
Plán pro mitigaci rizika	Varianta 1 (Chyba dodavatele SaaS): Přenesení rizika na dodavatele prostřednictvím smlouvy o podpoře. Striktní definice SLA s dostupností 99 % v

	pracovní době a reakční dobou na kritické chyby do 30 minut. • Varianta 2 (Chyba na pobočce): Zajištění záložního (např. 5G/LTE) internetového připojení na všech pobočkách ze strany zákazníka.
Krizový plán	• Uplatnění tvrdých finančních sankcí vůči dodavateli řešení. • Aktivace nouzového režimu (zpracování příjmů do servisu „papírovou“ metodou dle předem připraveného krizového manuálu) a pozdější ruční přepis dat do systému po obnovení spojení.

RZ04 – Nekvalitní nebo chybějící historická data při spuštění (Big Bang)

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global Cars
Pravděpodobnost výskytu:	Nízká - střední
Dopad	• Po lednovém spuštění systému nebudou v CRM dostupná správná data o zárukách a B2B klientech z minulosti. • Nemožnost spustit věrnostní program a slevy na náhradní díly hned od prvního dne. • Zmatky v účetnictví na začátku nového fiskálního roku.
Plán pro mitigaci rizika	• Aplikace strategie Read-only instance (starý systém zůstane na pobočkách dostupný pouze pro čtení pro dohledávání starých záruk). • Provedení důkladné účetní uzávěrky a fyzické inventury před termínem Go-Live (10. ledna 2027).
Krizový plán	• Jednání s dodavatelem o hromadných automatizovaných opravách databáze (skriptem) na základě zjištěných anomálií po spuštění. • Manuální dočišťování kritických B2B klientských profilů asistentkami na pobočkách v průběhu prvních měsíců ostrého provozu.

RZ05 – Nedostatečná digitální gramotnost zaměstnanců

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global cars / IT Konzultant ze strany Enterprise Solutions
Pravděpodobnost výskytu:	Střední - vysoká
Dopad	• Zaměstnanci (zejména technici v servisu) nebudou schopni efektivně ovládat nový systém. • Zpomalení odbavení zákazníků a prodloužení doby příjmu vozidel do servisu. • Zvýšená chybovost při zadávání dat, což znehodnotí výstupy pro management.
Plán pro mitigaci rizika	• Příprava intenzivního a na míru šitého školení, které zohlední nižší digitální dovednosti personálu. • Tvorba velmi jednoduchých, vizuálních "krok za krokem" manuálů přímo pro konkrétní úkony (např. nafocení vozidla).
Krizový plán	• Výrazné prodloužení fyzické podpory IT konzultantů přímo na pobočkách (beyond první týden). • Dočasné vyčlenění administrativního "superuživatele" na pobočce, který bude technikům s obsluhou asistovat, než získají patřičné návyky.

RZ06 – Neintuitivní uživatelské rozhraní systému

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Business analytik ze strany Enterprise Solutions / Klíčový uživatel ze strany Global cars
Pravděpodobnost výskytu:	Střední
Dopad	• Frustrace zaměstnanců a vznik silného odporu (rezistence) k provádění digitalizaci. • Snaha zaměstnanců obcházet systém a vracet se k původním papírovým nebo excelovým řešením. • Ztráta drahocenného času při hledání správných funkcí v nepřehledném menu.

Plán pro mitigaci rizika	• Zapojení klíčových uživatelů (příjemců techniků, obchodníků) do designu a testování UI již ve fázi prototypování (před samotným vývojem). • Důraz na absolutní minimalizaci kliknutí, jasné flow a předvyplněné šablony, aby systém uživatele naváděl.
Krizový plán	• Urychlený redesign a nasazení opravných patchů pro kritické obrazovky na základě zpětné vazby z pilotního provozu. • Zrušení nebo dočasné skrytí méně důležitých funkcí rozhraní, aby nedocházelo k matení uživatelů.

H. Roadmapa projektu

H.1) Projektový tým

S ohledem na důležitost nového informačního systému (CRM, rezervační modul a nový web), který se po nasazení stane klíčovým systémem společnosti Global cars, a.s., je nezbytné pro implementaci vytvořit odpovídající organizační strukturu. Ta bude zajišťovat komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem, operativní i strategické řízení projektu. Tým se skládá z následujících rolí:

- **Řídící komise** - nejvyšší projektová řídicí struktura projektu. Schvaluje a koordinuje klíčové plánované dodávky a milníky. Je nadřízená Projektovému řízení. Členi jsou nominováni z vrcholového managementu Global cars, a.s. a Enterprise Solutions, s.r.o. Jedná se o dozorný orgán nad projektem. V rámci projektu se ze strany Global cars očekává účast majitele společnosti a projektového manažera (Ing. Jan Kočí).
- **Projektový tým za Global cars, a.s.**
 - **Projektový manažer (zástupce vedení)**- má rozhodovací pravomoc a je odpovědný za řízení pracovníků Global cars v rámci projektu. Specifikuje požadavky na funkcionalitu a provádí průběžnou akceptaci.
 - **Klíčový uživatel systému**- zkušený zaměstnanci (např. vedoucí servisů, seniorní obchodníci), kteří detailně znají firemní procesy, definují požadavky pro Business analytika a účastní se testování.
 - **Běžný uživatel systému**- vybraní zaměstnanci (přijímací technici, řadoví prodejci), kteří jsou zapojeni do testování a ověřování uživatelské přívětivosti. Nemají rozhodovací pravomoc.
- **Projektový tým za Enterprise Solutions, s.r.o.** - je odpovědný za dodání výstupů ve stanovených termínech a kvalitě. V rámci projektu se využívají následující role:
 - **Projektový manažer (Mykhailo Plokhin)** - je odpovědný za koordinaci týmu, kontrolu součinnosti zákazníka a projektová rizika.
 - **Vedoucí analytik (Ivan Shestachenko)** - osoba odpovědná za mapování procesů, přípravu a vedení jednání se zákazníkem, vedení prezentací, kontrolu výstupů podřízených analytiků v týmu.
 - **Business analytik (Yernur Bauyrzhanuly)** - osoba odpovědná za analýzu byznys požadavků zákazníka a vytvoření UI/UX prototypu rozhraní.
 - **Systémový analytik (Daniil Sofin)** - osoba odpovědná za návrh systémové architektury, zpracování Business Model Canvas (BMC) a správu repozitáře.

- **IT Konzultanti / Podpora** - osoby zajišťující školení uživatelů a bezprostřední fyzickou asistenci na pobočkách v prvním týdnu po nasazení systému do ostrého provozu.

Činnosti rolí Enterprise Solutions, s.r.o. se budou v rámci projektu navzájem prolínat a v případě potřeby se do projektu, po dohodě s Global cars, a.s., mohou zapojit další pracovníci a IT konzultanti (např. pro zajištění fyzické podpory na všech 9 pobočkách v prvním týdnu po spuštění).

H.2) Součinnosti

Součinnost, kterou je v rámci implementace nového systému ze strany Global cars, a.s. nutné poskytnout dodavateli (Enterprise Solutions, s.r.o.), lze rozdělit na 3 typy: Zdroje, Projekty a Infrastruktura.

Zdroje

Jedná se o konkrétní součinnost jednotlivých členů projektového týmu zákazníka. Především je nutné provést následující aktivity:

- **Projektový manažer** - stanovení kompetentního zástupce, zajištění koordinace uvnitř firmy (zejména v kritických měsících s výjimkou tzv. Blackouts v prosinci a v létě, kdy součinnost nebude možná).
- **Klíčoví a běžní uživatelé** - zajistit jejich dostatečnou kapacitu pro analytické schůzky. Zákazník navíc vyčlení zaměstnance jedné pobočky pro měsíční pilotní a paralelní provoz (v listopadu/prosinci) k odladění procesů. Na začátku ledna 2027 musí uvolnit všechny zaměstnance na plošné centrální školení.
- **Testeři** - poskytnutí uživatelů pro uživatelské akceptační testy (UAT).
- **Členové řídicí komise** - pravidelná účast na klíčových schůzkách (např. finální schválení designu, odsouhlasení rozpočtu).

Projekty a okolní systémy

Ve společnosti v současné době neprobíhá žádný souběžný projekt s výjimkou kompletní tvorby zcela nového webu (od nuly). Nový informační systém do něj musí

být plně integrován (včetně klientské zóny po přihlášení a rezervačního formuláře). Pro radikální zjednodušení datové migrace zákazník zajistí, že na všech 9 pobočkách zůstane k termínu nasazení "zmrazená" (read-only) kopie starého systému pro dohledávání starých záruk a klientské historie. Zabrání se tak přenosu chybových transakcí.

Infrastruktura

Společnost Global cars, a.s. se v rámci transformace zabývá vlastního lokálního IT personálu, proto plnou správu systému a cloudové infrastruktury zajistí formou SLA smlouvy (24/7) dodavatel. Od zákazníka je vyžadováno pouze následující:

- Garantování fyzické připravenosti a provozuschopnosti stávajících stacionárních počítačů (požadavek: OS Windows, procesory AMD/Intel, min. 16 GB RAM) na všech pobočkách.
- Zajištění 10" tabletů(Android 15 verze) nebo mobilních telefonů s fotoaparátem pro přijímací techniky na pobočkách pro potřeby fotodokumentace.
- Zajištění dostatečně stabilního a propustného připojení k internetu pro komunikaci s cloudovým webovým klientem.


H.3) Etapa 1

Nyní následuje detailní popis realizace projektu. S ohledem na dohodnutou strategii se celá implementace a nasazení nového řešení u společnosti Global cars, a.s. uskuteční v rámci **jediné hlavní etapy** (Etapa 1).

Rozsah a zaměření etapy V této etapě bude nasazeno kompletní řešení informačního systému založeného na platformě INS@ček, které nahradí stávající roztržštěné aplikace na všech 9 pobočkách. Vzhledem k rozsahu prací budou jednotlivé funkcionality implementovány a nasazovány v pořadí dle jejich byznys priority (t.j. implementace Must-have funkcionalit jako prvních).

Harmonogram

Rozložení aktivit a činností Etapy 1 v čase, včetně jejich návazností a klíčových milníků, zachycuje přiložený Ganttův diagram (**Obrázek 5**).

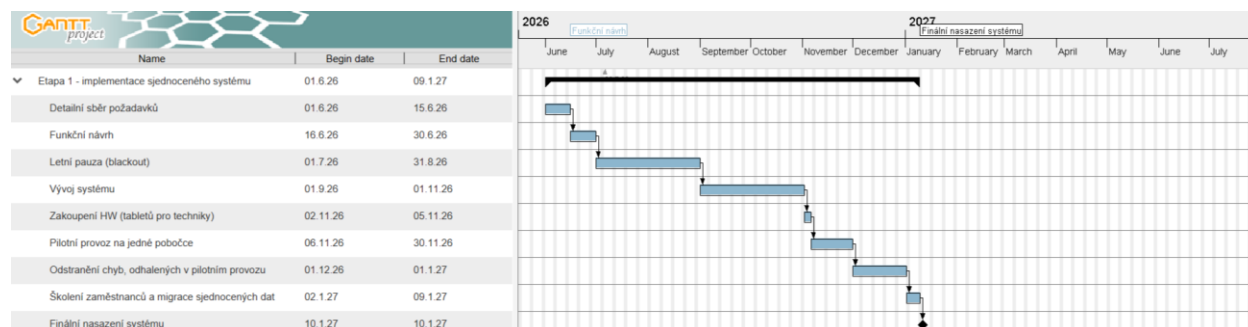

Obrázek 5. Harmonogram 1. etapy implementace systému

Realizace etapy je naplánována na období od 1. června 2026 do 10. ledna 2027. Fáze detailního sběru požadavků a funkčního návrhu proběhne v průběhu června. Následně harmonogram plně respektuje tzv. "Blackout" (červenec a srpen), kdy je z důvodu dovolených vývoj přerušen a neprobíhá žádná součinnost. Samotný vývoj systému bude probíhat na podzim (září–říjen). Klíčovým milníkem je spuštění měsíčního pilotního provozu na jedné vybrané pobočce v průběhu listopadu 2026. Následně proběhne odstranění případných chyb, plošné školení zaměstnanců, testovací migrace a k fixnímu datu **10. ledna 2027 dojde k finálnímu nasazení systému (Go-Live)** metodou Big Bang na všech pobočkách současně.

Odhad nákladů na realizaci etapy

Poslední položkou projektu jsou odhadované náklady na nasazení řešení z pohledu dodavatele (Enterprise Solutions, s.r.o.). Tento odhad je sestaven s ohledem na definované požadavky s maximální tolerancí odchylky +/- 20 %.

Odhadovaná cena za implementační práce činí celkem **2 725 000 Kč**. Tato částka se skládá ze standardní implementace modulů (analýza, konfigurace, migrace a nastavení práv v hodnotě 1 683 000 Kč) a z dodatečných nadstandardních prací, které zahrnují projektové řízení, přípravu na pilotní provoz a především zvýšenou fyzickou podporu IT konzultantů na všech pobočkách v kritickém týdnu po spuštění (v hodnotě 1 042 000 Kč).

Do celkové ceny nejsou zahrnuty náklady na pořízení fyzického hardwaru (stacionární PC, 10" tablety, internetové připojení). Společnost Global cars si tuto techniku zajistí před zahájením pilotního provozu u svých stávajících dodavatelů a ve vlastní režii.

Součinnosti

Klíčovým předpokladem pro dodržení harmonogramu a plynulou realizaci projektu je včasná a adekvátní součinnost zákazníka. Časové kapacity, které bude nutné ze strany zaměstnanců Global cars, a.s. do projektu alokovat, jsme rozdělili do těchto bloků:

- **Analýza, návrh a definice požadavků:** Zapojení klíčových uživatelů a manažerů pro tvorbu soupisu požadavků, definici migrace, přístupových práv a schválení dokumentace.
 - Kapacita cca: 223 člověkohodin.
- **Uživatelské testování:** Součinnost běžných a klíčových uživatelů při zkušební migraci dat, zaškolení před testováním a samotném testování v systému.
 - Kapacita cca: 120 člověkohodin.
- **Nasazení (Školení a pilotní provoz):** Nejrozsáhlejší položka součinnosti, která pokrývá intenzivní plošné školení všech zaměstnanců ze všech 9 poboček před ostrým startem a dedikaci pracovníků vybrané pobočky pro měsíční pilotní provoz.
 - Kapacita cca: 1 360 člověkohodin.
- **Projektové řízení:** Průběžná kooperace dedikovaného projektového manažera za Global cars a účast vrcholového vedení na schůzkách řídicí komise.
 - Kapacita cca: 92 člověkohodin.

Očekávaná celková minimální součinnost ze strany Global cars pro realizaci Etapy 1 činí celkem **1 795 člověkohodin**.

H.4) Vize dalšího rozvoje systému

V současné době je prioritou úspěšně dokončit pilotní provoz a zajistit plošné nasazení (Go-Live) celého nového řešení do fixně stanoveného termínu cca 10. ledna 2027. Z toho důvodu je předčasné detailně plánovat obsah a zaměření dalšího rozvoje systému nad rámec aktuálně sjednaného rozsahu. Jednou z možností budoucího rozvoje je plná

elektronická integrace (API) s lokálními dodavateli náhradních dílů. Tato funkcionality byla v aktuální fázi odložena z důvodu technologické nepřipravenosti na straně dodavatelů (systém bude zatím generovat objednávky do PDF a odesílat je e-mailem). Další případnou nadstavbou by mohla být detailní skladová evidence veškerého drobného spotřebního materiálu (např. přesná evidence spotřeby specifických typů olejů), od které zákazník v první fázi vědomě upustil ve prospěch stávajícího řešení fyzických visaček. Jednalo by se v tuto chvíli o zbytečnou investici a administrativní zátěž, která by mohla ohrozit stanovený termín dokončení implementace a zkomplikovat úvodní fázi adopce systému ze strany zaměstnanců. Během analýzy nebyly identifikovány žádné další kritické funkčnosti, které by bylo nutné do systému bezprostředně po ostrém startu implementovat. Společnost Enterprise Solutions, s.r.o. však na základě svých zkušeností doporučuje společnosti Global cars, a.s., aby po prvním roce reálného provozu provedla komplexní zpětné vyhodnocení funkčnosti a celkového přínosu systému. Následně bude v rámci tohoto vyhodnocení možné rozhodnout o:

- dodatečné úpravě a fixaci pravidel pro výpočet odměňovacích metrik (KPI), které se budou v prvních fázích po nasazení ladit za pochodu,
- případném dalším rozšíření funkcionalit na základě reálných zkušeností a zpětné vazby uživatelů na pobočkách.

H.6) Podpora systému po nasazení

V rámci reálného provozu bude společnosti Global cars, a.s. ze strany dodavatele Enterprise Solutions, s.r.o. poskytována následující podpora systému:

- **Maintenance systému INS@ček** – Zákazník má nárok na všechny vydané aktualizace systému INS@ček, který tvoří technologické jádro celého řešení. Tento nárok se nevztahuje na specifické úpravy a nové funkcionality, které byly nebo budou vyvinuty výhradně pro individuální potřeby Global cars. V prvním roce provozu je tento nárok zahrnut v celkové ceně implementace. Od druhého roku je Global cars povinna hradit roční poplatek za maintenance ve výši 20 % z aktuální ceny licencí využívaných zákazníkem. Dle stávajícího rozsahu licencí (1 390 000 Kč) činí tento poplatek **278 000 Kč** ročně.
- **Podpora a provoz systému** – Vzhledem k tomu, že společnost Global cars, a.s. v rámci své strategie zcela ruší vlastní interní IT oddělení a zbavuje se veškeré správy IT, přebírá kompletní údržbu systému, správu cloudové infrastruktury a garanci plynulého běhu dodavatel. Součástí této podpory je služba Helpdesku pro hlášení

provozních incidentů a požadavků na další rozvoj systému, která bude dostupná v režimu 24/7. Roční náklady na tuto komplexní podporu jsou předběžně vyčísleny na **480 000 Kč**. Tato částka je orientační; detailní výčet poskytovaných služeb, reakční doby a garantované parametry dostupnosti (resolution time) budou definovány v samostatné servisní smlouvě (**SLA**), která bude podepsána se zákazníkem.

H.7) Projektová rizika

Projektová rizika, uvedená v této kapitole, odpovídají nejčastějším rizikům, která se při realizaci informačních systémů objevují a která byla identifikována během analytických jednání mezi dodavatelem (Enterprise Solutions, s.r.o.) a zákazníkem (Global cars, a.s.).

Uvádíme tabulku číselných hodnot pravděpodobnosti nastání rizik pro tuto kapitolu:

Nulová	0 % až 0.99 %
Nízká	1 % až 14.99 %
Střední	15 % až 44.99 %
Vysoká	45 % až 100 %

Poznámka: Hodnoty pravděpodobnosti vycházejí ze zkušenosti dodavatele studie, specifik autonomního fungování 9 poboček zákazníka a diskuse nad kapacitními omezeními.

RP01 – Nasazení systému po plánovaném termínu (10. ledna 2027)

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global cars Projektový manažer ze strany Enterprise Solutions
Pravděpodobnost výskytu:	Nízká - střední
Dopad	• Nedodržení fixního termínu ostrého startu (Go-Live) a narušení návaznosti na účetní uzávěrku. • Prodloužení status quo (procesní roztříštěnost). • Finanční ztráty z důvodu opožděného náběhu optimalizovaných procesů. • Hrozba uplatnění vysokých smluvních sankcí vůči dodavateli.
Plán pro mitigaci rizika	• Důsledné naplánování iterativního přístupu: analytické práce v červnu, pilotní provoz v listopadu 2026. • Plánování veškerých akceptací mimo nahlášená období provozních špiček a dovolených zákazníka (červenec, srpen, prosinec).

	• Průběžné a transparentní reportování stavu projektu na řídicí komisi.
Krizový plán	• Zvýšené úsilí a nasazení dodatečných kapacit projektového týmu. • Svolání řídicí komise a diskuse o omezení rozsahu nasazované funkcionality (změna „trojimperativu“) ve prospěch udržení termínu.

RP02 – Nedostatečná kapacita týmu při plošném roll-outu

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global cars
Pravděpodobnost výskytu:	Nízká
Dopad	• Dopad na kvalitu podpory uživatelů v kritickém prvním týdnu ostrého provozu. • Zmatek při zavádění nových procesů do praxe na 9 pobočkách současně. • Ohrožení garancí plynoucích ze servisní smlouvy (SLA).
Plán pro mitigaci rizika	• Včasné alokování dostatečného množství IT konzultantů (odhadem 45 MDs pro první týden) s adekvátním mixem juniorních a seniorních expertů. • Vytvoření detailního harmonogramu výjezdů na pobočky v předstihu.
Krizový plán	• Okamžité nasazení externích subdodavatelských kapacit na podporu uživatelů. • Krizová prioritizace fyzické podpory pouze na pobočky s největším objemem zákazníků (např. Praha, Ostrava).

RP03 – Nedostatečná součinnost zákazníka

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový vedoucí ze strany Global cars
Pravděpodobnost výskytu:	Střední

Dopad	• Dopad na kvalitu a termín dodání výstupů projektu (nemožnost uzavřít analytickou fázi včas). • Chybějící klíčová data pro testování. • Frustrace členů projektového týmu.
Plán pro mitigaci rizika	• Včasná eskalace problému na nejvyšší vedení s využitím jeho deklarovaného autokratického přístupu. • Striktní dodržování domluveného projektového harmonogramu s ohledem na nahlášené blackout(výpadky kapacit na straně Global cars).
Krizový plán	• Dohoda se zákazníkem o posunu termínu pilotního provozu. • Svolání řídicí komise, která vyvodí důsledky směrem k nekomunikujícím manažerům lokálních poboček.

RP04 – Problémy s integrací a datovou migrací

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový manažer ze strany Enterprise Solutions → Systémový analytik ze strany Enterprise Solutions
Pravděpodobnost výskytu:	Nízká
Dopad	• Neschopnost naplnit jednotnou databázi validními daty ze starých systémů (textových souborů). • Znehodnocení CRM modulu historickým „balastem“. • Nemožnost správně nastavit věrnostní program pro stávající B2B klienty.
Plán pro mitigaci rizika	• Aplikace strategie „Read-only instance“ (stará data se nebudou plošně migrovat, zůstanou k nahlédnutí ve starém systému). • Naplánování testovací datové migrace (UAT) v dostatečném předstihu před nasazením. • Úzká spolupráce analytiků s lokálními správci dat na pobočkách.

	• Průběžné a transparentní reportování stavu projektu na řídicí komisi.
Krizový plán	• Nasazení systému s čistou databází („začátek od nuly“) a manuální dočišťování/přepisování kritických klientských profilů až za chodu systému. • Svolání řídicí komise, která rozhodne o změně harmonogramu plného spuštění CRM funkcionalit.

RP05 – Nedostatečné profesní pokrytí projektového týmu

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Projektový manažer ze strany Enterprise Solutions
Pravděpodobnost výskytu:	Střední
Dopad	• Přidělení velkého počtu juniorních vývojářů a analytiků nenahradí chybějící zkušenosti seniorů, což povede k chybám v návrhu řešení. • Výrazné zpoždění vývoje složitých architektonických částí systému a prodloužení fáze testování. • Ohrožení fixního termínu finálního nasazení (10. ledna 2027).
Plán pro mitigaci rizika	• Včasná alokace a pevná rezervace kapacit seniorních architektů a expertů na problematiku dlouho před startem projektu. • Zavedení přísného procesu kontrol (code-review), kdy práci juniorů pravidelně kontrolují a schvalují zkušení senioři.
Krizový plán	• Okamžité najmutí externích seniorních kontraktorů na volné noze (freelancerů) s expertní znalostí pro "hašení" problémů, a to i za cenu snížení finanční marže dodavatele z celého projektu.

I. Finance

Cílem této kapitoly je detailně vyhodnotit ekonomickou efektivitu navržené digitální transformace. Finanční model agreguje počáteční investiční náklady, pravidelné provozní výdaje a očekávané finanční přínosy pramenící z optimalizace firemních procesů.

Počáteční investice a náklady na implementaci

Vstupní náklady projektu zahrnují pořízení licencí systému INS@ček a veškeré odborné práce spojené s jeho nasazením. Podrobný rozpad těchto položek, které tvoří celkovou investici ve výši 4 125 000 Kč bez DPH, uvádí **Tabulka 1**.

	A	B	C	D
1	Doplňkové položky instalace			
2				
3	Položka	Cena za jednotku bez DPH	Počet	Celkem
4	Instalace serveru	4,000 Kč	0	0 Kč
5	Instalace databáze	4,000 Kč	0	0 Kč
6	Instalační balíček databáze + aplikační server	6,000 Kč	0	0 Kč
7	Rozšíření o další jazyk uživatelského rozhraní	10,000 Kč	1	10,000 Kč
8		Celkem ostatní náklady:		10000
9				
10	Výsledná cena za implementaci			
11				
12	Položka	Cena (bez DPH)		
13	Licence	1,390,000 Kč		
14	Implementační práce Etapa 1	2,725,000 Kč		
15	Implementační práce Etapa 2	0 Kč		
16	Ostatní náklady	10,000 Kč		
17	Implementace celkem	4,125,000 Kč		
18	Maintenance poplatky (20% z licencí)	278,000 Kč		
19				

Tabulka 1. Cena za implementaci

Tabulka 1 ukazuje, že veškeré práce na nasazení systému proběhnou v jediné etapě. Z celkové částky jde 2 725 000 Kč na samotnou implementaci, což zahrnuje vše od úvodního nastavení až po podporu při spuštění na pobočkách. Zbýlých 1 390 000 Kč stojí jednorázové pořízení softwarových licencí.

Výpočet provozních přínosů a úspor

Ekonomická návratnost projektu je postavena na predikci dodatečného zisku, který bude generován prostřednictvím zvýšené efektivity prodeje a servisu, a to bez nutnosti navyšovat personální kapacity zákazníka. Metodika výpočtu těchto úspor je rozepsána v **Tabulce 2**.

L22 $\times$ $\checkmark$ f_x $=L15*L16*L21-(L15*L16)$				
	H	I	J	K
4				
5				Obrat autoprodaje (Kč)
6				Ziskovost autoprodaje
7				
8				Zvýšení obratu autoprodaje 1. rok po spuštění
9				Úspory v autoprodaji 1. rok po spuštění (Kč)
10				
11				Zvýšení obratu autoprodaje 2. rok po spuštění
12				Úspory v autoprodaji 2. rok po spuštění (Kč)
13				
14				
15				Obrat autoservisu (Kč)
16	(bez započítání diskontu)			Ziskovost autoservisu
17				
18	(za dobu pěti let provozu systému)			Zvýšení obratu autoservisu 1. rok po spuštění
19				Úspory v autoservisu 1. rok po spuštění (Kč)
20				
21				Zvýšení obratu autoservisu 2. - 5. rok po spuštění
22				Úspory v autoservisu 2. - 5. rok po spuštění (Kč)
23				
24				
25				Roční úspory na náboru nových zaměstnanců 2. - 5. rok po spuštění (Kč)
26				
27				
28				Celkové úspory 1. rok po spuštění (Kč)
29				Celkové úspory 2. - 5. rok po spuštění (Kč)
30				

Tabulka 2. Úspory dosažené nasazením systému

Jak prokazuje Tabulka 2, u divize autoprodaje (při výchozím ročním obratu 300 mil. Kč) je kalkulován růst o 10 % v prvním roce a o 20 % v letech následujících. V divizi autoservisu (při obratu 70 mil. Kč) zajistí optimalizace plánování kapacit zvýšení užitečné vytiženosti, což po stabilizaci provozu generuje roční přínos 4 200 000 Kč. Model dále počítá s fixní roční úsporou 800 000 Kč na náborových procesech, neboť stávající personál díky

digitalizaci obslouží vyšší objem zakázek. Celkové úspory tak dosahují 4 500 000 Kč v náběhovém roce a 9 800 000 Kč v každém dalším roce.

Dlouhodobá analýza peněžních toků a návratnost (ROI)

Závěrečná analýza finančních toků, nákladů na podporu a maintenance je předmětem **Tabulky 3**.

Pro výpočet čisté současné hodnoty (NPV) byla použita diskontní sazba ve výši 6 %.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Finanční analýza za období implementace a následujících pěti let provozu								
2									
3	Použitá diskontní sazba:	6%							
4									
5	Rok	0	1	2	3	4	5		
6	Licence	-1,390,000 Kč							
7	Etapa 1	-2,725,000 Kč							
8	Etapa 2	0 Kč							
9	Ostatní náklady	-10,000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
10	Maintenance		0 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč		
11	Podpora	-480,000 Kč	-480,000 Kč	-480,000 Kč	-480,000 Kč	-480,000 Kč	-480,000 Kč		
12	Úspory		4,500,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč		
13	CF	-4,605,000 Kč	4,020,000 Kč	9,042,000 Kč	9,042,000 Kč	9,042,000 Kč	9,042,000 Kč		
14	DCF	-4,605,000 Kč	3,792,453 Kč	8,047,348 Kč	7,591,838 Kč	7,162,111 Kč	6,756,708 Kč		
15	Náklady celkem (za 5 let)						7,637,000 Kč		
16	Úspory celkem (za 5 let)						43,700,000 Kč	(bez započítání diskontu)	
17	NPV						28,745,457.50 Kč		
18	ROI*						472%	(za dobu pěti let provozu systému)	
19									
20	*ROI = ((úspory celkem - náklady celkem)/náklady celkem)*100								

Tabulka 3. Finanční analýza

Z výsledků v Tabulce 3 je patrné, že i při započítání ročních nákladů na podporu a cloudovou infrastrukturu (480 000 Kč) a maintenance (278 000 Kč počínaje druhým rokem) vykazuje projekt vysokou ziskovost. Čistá současná hodnota (NPV) dosahuje hodnoty **28 745 457 Kč** a ukazatel návratnosti investice (**ROI**) představuje **472 %**.

Závěrem je nutné upozornit, že tento finanční model nezahrnuje přímé náklady na pořízení fyzického hardwaru (stacionární PC, tablety) a neocenňuje 1 795 člověkohodin interní součinnosti zaměstnanců zákazníka, které jsou pro úspěšné spuštění nezbytné. I po započítání těchto dalších výdajů a případné 20 % odchylce v odhadech dává projekt jasný ekonomický smysl. Investice se společnosti jednoznačně vyplatí a peníze se rychle vrátí.

J. ZÁVĚR

Tento dokument úvodní studie vznikl na základě potřeby společnosti Global cars, a.s. sjednotit vnitřní procesy a zajistit moderní ICT podporu prodeje a servisu napříč svými 9 doposud autonomními pobočkami. Obsahuje analýzu aktuálního stavu situace ve společnosti (absence CRM, manuální rezervace, roztříštěnost postupů), návrh vhodného technologického řešení a definici projektu spojeného s jeho implementací a nasazením. V rámci definovaného projektu je reflektováno dodržení klíčových termínů, zejména zahájení pilotního provozu v listopadu 2026 a plného nasazení (Go-Live) k 10. lednu 2027. V závěru je provedeno vyhodnocení předpokládané návratnosti investice (ROI). Společnost Global cars díky této studii získala podklady pro rozhodnutí, zda navržené řešení implementovat a modernizovat tak své podnikání v souladu s aktuálními trendy.

Při tvorbě dokumentu byly zvažovány různé varianty řešení tak, aby byly v souladu s firemní strategií maximalizace vytiženosti zdrojů bez zbytečných časových rezerv. Nakonec bylo zvoleno cloudové řešení postavené na dynamickém a parametrizovatelném modulu CRM a online rezervačním systému, doplněném o digitalizaci příjmu prostřednictvím mobilních terminálů (tabletů Android 15 verze). Očekávané přínosy řešení- zvýšení prodeje vozů o 10 % a servisní kapacity o 20 % - představují potenciál dodatečného ročního obrátu ve výši přes 44 milionů Kč. S ohledem na tyto skutečnosti a přiměřené investiční i provozní náklady je využití navrženého řešení z pohledu Global cars, a.s. vysoce výhodné a zaručuje rychlou návratnost.

Před implementací je nutné si uvědomit, že ze strany Global cars je nezbytné poskytnout odpovídající součinnost. Klíčová bude zejména plná a autokratická podpora ze strany nejvyššího vedení při prosazování nového systému do praxe a překonávání počáteční rezistence zaměstnanců. Dále je nutné vyhradit interní kapacity pro pilotní testování a plošná školení zaměstnanců před samotným spuštěním, včetně zajištění kooperace při fyzické přítomnosti IT konzultantů na všech 9 pobočkách v prvním týdnu ostrého provozu.

Na závěr studie lze konstatovat, že hlavní cíl, kterým bylo navrhnout řešení pro informační a procesní sjednocení společnosti Global cars, byl plně naplněn. Vedlejším cílem práce na studii bylo ukázat schopnosti společnosti Enterprise Solutions, s.r.o. jako spolehlivého dodavatele a integrátora inovativních IT řešení. Věříme, že kvalita odvedené práce a tohoto dokumentu jsou začátkem úspěšné a dlouhodobé spolupráce. S ohledem na striktní časový harmonogram, nutnost zahájit analytické práce již 1. června 2026 a definovaná období provozních výpadků na straně zákazníka, doporučuje dodavatel společnosti Global cars, aby o zahájení implementace rozhodla co nejdříve po akceptaci této úvodní studie.
