

Global cars, a.s.

Digitální transformace

Úvodní studie

A. Executive summary	4
A.1) Zadání.....	4
A.2) Vize.....	4
A.3) Roadmapa	5
A.4) Harmonogram	6
A.5) Cena.....	6
A.6) Součinnost	6
C. Slovník.....	6
D. Přílohy.....	8
D.1) Licenční model, ceny prací	8
D.2) Harmonogram projektu ve formátu PNG	8
D.3) Harmonogram projektu ve formátu GAN (GanttProject)	8
E. Zadání úvodní studie.....	8
E.1) Vstupní zadání.....	8
E.2) Záměr	8
E.3) Aktuální problémy (business problematika)	9
E.4) SWOT analýza Global cars, a.s.....	9
F. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ	12
F.1) Klíčové požadavky na provoz systému	12
F.2) Technologická a jiná omezení	12
F.3) FURPS+ analýza informačního systému Global cars.....	13
a) Funkční.....	13
b) Použitelnost	13
c) Spolehlivost	14
d) Výkon.....	14
e) Podporovatelnost	14
f) Další nefunkční požadavky	14
G. BUDOUCÍ STAV.....	15
G.1) Vize řešení.....	15

G.2) Strategie naplnění vize řešení	16
G.3) Přínosy navrženého řešení.....	16
G.4) Rizika navrženého řešení	18
RZ01 - Nízká efektivita a finanční stagnace (Současný stav)	18
H. Roadmapa projektu.....	21
H.1) Projektový tým	21
H.2) Součinnosti.....	22
H.3) Etapa 1	23
H.4) Vize dalšího rozvoje systému.....	23
H.6) Podpora systému po nasazení.....	24
H.7) Projektová rizika.....	24
RP01 - Nasazení systému po plánovaném termínu (10. ledna 2027).....	24
RP02 - Nedostatečná kapacita týmu při plošném roll-outu.....	25
RP03 - Nedostatečná součinnost zákazníka.....	26
RP04 - Problémy s integrací a datovou migrací	26
I. Finance	27
J. ZÁVĚR.....	29

A. Executive summary


A.1) Zadání

Cílem projektu je informační a procesní sjednocení poboček Global cars, a.s. Firma aktuálně provozuje 9 poboček v ČR v autonomním režimu . Zadavatel požaduje odstranění nedostatků v ICT podpoře prodeje, zavedení CRM a rezervačního systému pro servis. Klíčovým milníkem projektu je start nového ICT systému k 10. lednu 2027.

A.2) Vize

Navržené řešení spočívá v implementaci jednotného, modulárního a škálovatelného informačního systému postaveného na sjednocené databázi sdílené napříč celou sítí poboček. Systém nahradí manuální procesy prodeje a servisu moderními digitálními nástroji:

- **CRM modul:** Standardizovaný sběr dat o zákaznících (včetně sledování rozpočtových cyklů firem) pro zefektivnění prodeje
- **Rezervační systém servisu:** Online rozhraní pro zákazníky a mobilní terminály (tablety) pro techniky umožňující přesné plánování kapacit a okamžitou fotodokumentaci
- **Transparentnost:** Nástroje pro management, umožňující sledování KPI a výkonu zaměstnanců

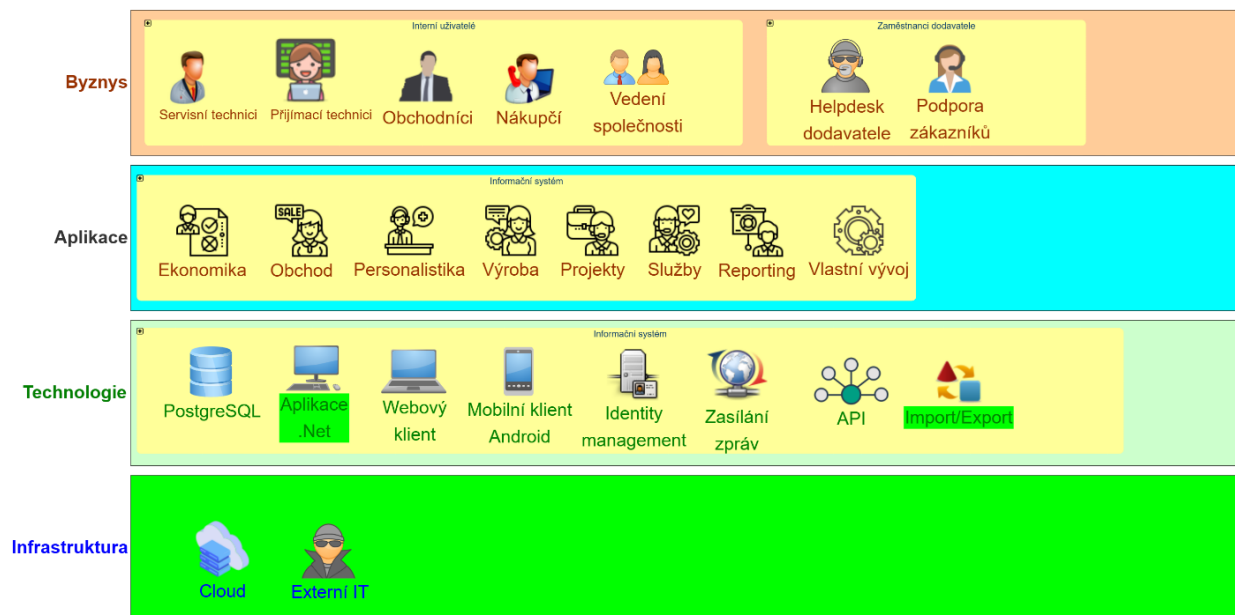

A.3) Roadmapa

S ohledem na provozní specifika společnosti Global cars, a.s. je projekt rozdělen na hlavní realizační etapu a následné období podpory.

Harmonogram plně respektuje definovaná období „Blackouts“ (červenec, srpen a prosinec), kdy zákazník nemůže poskytovat součinnost.

- **Etapa 1 - Implementace sjednoceného systému (červen 2026 - leden 2027)**
Tato klíčová etapa pokrývá celý životní cyklus zavedení systému od úvodní analýzy až po nasazení nového systému na všech 9 pobočkách
- **Podpora a stabilizace (od ledna 2027)**
Bezprostředně po nasazení následuje fáze zvýšené péče. V prvním týdnu provozu bude zajištěna fyzická přítomnost IT konzultantů dodavatele na každé z 9 poboček pro podporu zaměstnanců při rutinních operacích. Následně systém přechází do režimu standardní podpory dle definovaného SLA (24/7) s plánovanou životností řešení 5 let

A.4) Harmonogram

Podrobnější časový rozpad jednotlivých etap

A.5) Cena

Doplňkové položky instalace					
Položka	Cena za jednotku bez DPH	Počet	Celkem		
Instalace serveru	4,000 Kč	0	0 Kč		
Instalace databáze	4,000 Kč	0	0 Kč		
Instalační balíček databáze + aplikační server	6,000 Kč	0	0 Kč		
Rozšíření o další jazyk uživatelského rozhraní	10,000 Kč	1	10,000 Kč		
Celkem ostatní náklady:			10000		
Výsledná cena za implementaci					
Položka	Cena (bez DPH)				
Licence	1,390,000 Kč			Pracovních dnů mezi začátkem realizace a datem spuštění do provozu:	153
Implementační práce Etapa 1	10,036,000 Kč			Dostupnost (docházka) členů týmu dodavatele	0.9
Implementační práce Etapa 2	0 Kč			Délka pracovního dne (čl):	8
Ostatní náklady	10,000 Kč			Počet lidí v týmu dodavatele:	8
Implementace celkem	11,436,000 Kč			Průměrná cena za člověkohodinu u člena týmu dodavatele (Kč)	1000
Maintenance poplatek (20% z licencí)	278,000 Kč			Částka celkem (Kč):	8 812 800
				Pracovních dnů mezi začátkem realizace a datem spuštění do provozu:	153
				Dostupnost (docházka) členů týmu ze strany zákazníka	0.1
				Délka pracovního dne (čl):	8
				Počet lidí v týmu ze strany zákazníka:	10
				Průměrná cena za člověkohodinu u člena týmu ze strany zákazníka (Kč)	1000
				Částka celkem (Kč):	1 224 000

A.6) Součinnost

C. Slovník

Zkratka	Popis změn
AS-IS	Současný (výchozí) stav procesů a systémů ve společnosti před implementací nového řešení.
Big Bang	Strategie jednorázového spuštění nového informačního systému do ostrého provozu současně na všech 9 pobočkách (naplánováno na leden 2027).
CRM	Customer Relationship Management- informační systém pro řízení vztahů se zákazníky, evidenci klientské historie a podporu prodeje.
Paralelní provoz	Fáze testování, při které se jeden měsíc účtují transakce souběžně ve starém i novém systému na jedné vybrané pobočce pro ověření správnosti dat a uzávěrek.
Read-only instance	Původní informační systém (historické reziduum), který po spuštění nového řešení zůstane na pobočkách pouze pro čtení (pro dohledávání starých záruk), čímž se radikálně zjednoduší datová migrace.

SLA	Service Level Agreement- smlouva o úrovni poskytovaných IT služeb a podpory. Využívá se, jelikož zákazník do budoucna nepočítá s vlastním IT oddělením.
SWOT analýza	Analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek spolu s příležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats).
TO-BE	Cílový (budoucí) stav procesů a systémů po úspěšné implementaci navrženého řešení.
SaaS	Software as a Service (Software jako služba) - Model distribuce softwaru, kde je systém hostován a provozován poskytovatelem v cloudu. Zákazník k němu přistupuje přes internet a platí za jeho užívání, čímž odpadá nutnost instalace a údržby na vlastních lokálních serverech.
GDPR	General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Soubor přísných evropských pravidel pro bezpečné shromažďování, uchovávání a zpracování osobních dat klientů i zaměstnanců (klíčové pro návrh CRM modulu).
ICT	Information and Communication Technologies - Informační a komunikační technologie. Souhrnný pojem zahrnující veškerý hardware, software, počítačové sítě a komunikační prostředky nutné pro digitální chod společnosti.
UAT	User Acceptance Testing - Uživatelské akceptační testování. Závěrečná fáze testování, během které vybraní zaměstnanci zákazníka zkoušejí práci v novém systému a ověřují, zda řešení v praxi splňuje předem dohodnuté požadavky.
API	Application Programming Interface - Rozhraní pro programování aplikací. Slouží jako komunikační most, který umožňuje bezpečnou a automatizovanou výměnu dat mezi dvěma zcela odlišnými systémy (např. napojení vašeho systému na externího dodavatele náhradních dílů).
KPI	Key Performance Indicator - Klíčový ukazatel výkonnosti. Měřitelná metrika sloužící k vyhodnocení toho, jak dobře společnost, pobočka nebo konkrétní zaměstnanec plní stanovené cíle (např. vytiženost mechanika jako podklad pro výpočet mzdy).
B2B	Business-to-Business - Obchodní vztah probíhající výhradně mezi dvěma společnostmi. V kontextu projektu jde například o prodej a servis firemních vozových flotil (tyto nákupy mají jiná pravidla, např. čekají na schválení ročních firemních rozpočtů).
B2C	Business-to-Consumer - Obchodní vztah zaměřený přímo na koncového spotřebitele. Jde o běžného zákazníka (fyzickou osobu), který si kupuje vůz nebo objednává servis pro osobní, nikoliv firemní účely.
Blackouts	Kritická období, kdy nebude poskytována součinnost z důvodu nedostatku kapacit

D. Přílohy

D.1) Licenční model, ceny prací

D.2) Harmonogram projektu ve formátu PNG

D.3) Harmonogram projektu ve formátu GAN (GanttProject)

E. Zadání úvodní studie

E.1) Vstupní zadání

Hledáme komplexní řešení pro informační a procesní sjednocení společnosti Global cars, a.s. Klíčovým milníkem pro plné nasazení systému do ostrého provozu (metodou Big Bang na všech pobočkách současně) je cca 10. ledna 2027, aby bylo možné navázat na účetní uzávěrku a fyzickou inventuru z konce fiskálního roku.

E.2) Záměr

Během dodatečných diskusí se zákazníkem bylo upřesněno úvodní zadání společnosti Global cars, a.s. Společně se došlo k následujícím konkrétním záměrům:

- Obchodní činnost je založena na prodeji a autorizovaném servisu vozů Hyundai napříč 9 autonomními pobočkami v ČR.
- Hlavním záměrem je finanční růst bez nutnosti nabírat nový personál: zvýšení prodeje nových aut o 10 % v prvním roce a o 5 % v druhém roce (při stávajícím obratu cca 300 mil. Kč a 8% marži) a zvýšení efektivity servisu o 20 % (při obratu cca 124 mil. Kč a 20% marži).
- Vytvoření zcela nového, plně responzivního webu (s ohledem na to, že většina zákazníků přistupuje z mobilních zařízení) s podporou české a anglické lokalizace.
- Zbavit se veškeré interní správy IT. Současní lokální IT junioři budou propuštěni nebo přeraženi a kompletní údržbu systému převezme dodavatel formou měsíční SLA smlouvy.

- Konsolidovat nákupní kanály k jednomu hlavnímu distributorovi s cílem získat lepší nákupní ceny.

E.3) Aktuální problémy (business problematika)

Problémy, které jsou z pohledu řešení zásadní a které mají vliv na stávající i budoucí fungování Global cars, a.s.:

- Společnost operuje na hraně rentability. Chybí volné finanční prostředky pro rozvoj poboček a adekvátní odměňování klíčových prodejců, u kterých hrozí odchod ke konkurenci.
- Klientská historie a data o prodejích se evidují nejednotně a neefektivně, což znemožňuje analytické vytěžování B2B dat.
- Efektivita využití kapacity servisu je odhadována pouze na 70 %.
- Účetní a transakční data ve starých systémech jsou vysoce chybová a roztříštěná, což představuje kritické riziko pro plnou datovou migraci do nového systému.
- Systém nyní nevyužívá cloudové řešení a hrozí zde riziko spojené s ochranou osobních údajů při případném využití amerických datacenter (zákazník preferuje data centra striktně na území EU z důvodu legislativy).

E.4) SWOT analýza Global cars, a.s.

Všechny klíčové vlastnosti Global cars, a.s., s ohledem na zadání a nově zjištěné finanční a provozní skutečnosti, přehledně shrnuje Tabulka 1 v podobě SWOT analýzy.

Strengths (silné stránky)	• Silné tržní postavení a pokrytí prostřednictvím sítě 9 poboček v ČR. • Stabilní a vysoký kumulativní roční obrat dosahující 370 milionů Kč. • Poskytování komplexních služeb pod jednou střechou (prodej, servis, půjčovna vozů). • Pevné obchodní vztahy se zákazníky na základě osobního / rodinného přístupu
Weaknesses (slabé stránky)	• Nízká užitečná vytíženost zaměstnanců a pracovišť autoservisu (kolem 70 %) • Zákazníci musejí zbytečně čekat ve frontách před autoservisem • Špatná připravenost na návštěvy jednotlivých zákazníků u autoprodeje a autoservisu • Důležité obchodní informace o jednotlivých zákaznících jsou špatně evidované • Není business intelligence směrem k zákazníkům • Absence digitalizace • Provozování byznysu na úrovni "kladné nuly" s minimálním rozpočtem na inovace a mzdy. • Informační systémy jednotlivých poboček jsou roztříštěné

Opportunities (příležitosti)	• Skokový růst prodeje (o 10 % v 1. roce) a servisu (o 20 %) pomocí nového responzivního webu a CRM. • Sjednocení nákupů a získání lepších cen od dodavatelů. • Zvýšení efektivity díky komplexní digitalizaci: Úplná automatizace procesů, která umožní pokrýt rostoucí nároky byznysu bez nutnosti nábory nových zaměstnanců.
Threats (hrozby)	• Propad finančních výsledků z aktuální „kladné nuly“ do reálné finanční ztráty. • Odchod klíčových zaměstnanců z důvodu chybějící motivace a neexistence odměňovacího systému. • Úbytek stávajících zákazníků a pokles akvizice nových klientů kvůli nízké kvalitě poskytovaných služeb. • Ztráta tržního podílu a porážka od silnějších, dynamicky se rozvíjejících konkurentů na trhu autosalonů (jako důsledek výše uvedených faktorů).

Tabulka 1. SWOT analýza.

F. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ

F.1) Klíčové požadavky na provoz systému

Vzhledem k tomu, že cílem projektu je komplexní digitalizace a sjednocení procesů napříč 9 autonomními pobočkami Global cars, a.s., byly identifikovány následující požadavky na provoz řešení:

- Zákazník nedisponuje rozsáhlým centrálním IT oddělením pro vývoj a správu složitých architektur. Z toho důvodu je navrhované řešení koncipováno jako cloudová služba (SaaS), jejíž plynulý běh a údržbu infrastruktury zajišťuje dodavatel (Enterprise Solutions, s.r.o.) a juniorní IT pracovník na každé pobočce.
- Dodatečný hardware nutný pro obsluhu systému na pobočkách bude pořízen přímo společností Global cars.
- IT podpora a garance běhu systému, včetně odstraňování chyb, bude smluvně zajištěna formou SLA ze strany dodavatele.
- Zákazník se zavazuje zajistit stabilní internetové připojení na všech 9 pobočkách a vybavit zaměstnance odpovídajícím hardwarem.

F.2) Technologická a jiná omezení

Podrobnější technologické požadavky a omezení na tvorbu a provoz systému byly po diskusích se zákazníkem stanoveny následovně:

- Pro běh webového klienta (back-office) postačí stávající stacionární PC stanice zaměstnanců (požadavek na procesory AMD/Intel a min. 16 GB RAM).
- Přijímací technici v servisu musí být nově vybaveni mobilními zařízeními (ideálně 10" tablety z Android 15 verze) z důvodu nutnosti okamžité fotodokumentace vozidel.
- Informační obrazovky v zákaznických zónách (lobby) na pobočkách musí umět zobrazovat webové rozhraní pro anonymizované sledování postupu opravy v reálném čase.

- Architektura nesmí spoléhat na technologickou připravenost lokálních dodavatelů náhradních dílů. V případě absence API na straně dodavatele musí systém umět vygenerovat objednávku do formátu PDF a automaticky ji odeslat e-mailem.

F.3) FURPS+ analýza informačního systému Global cars

a) Funkční

- Jednotný modul CRM: strukturovaná evidence B2B a B2C zákazníků, klientské historie nákupů a oprav. Sledování nákupních zvyklostí a technických preferencí.
- Online rezervační systém autoservisu: evidence času, zdrojů a techniků. Systém nesmí obsahovat skryté časové rezervy, kapacity musí být plánovány přesně.
- Integrace věrnostního programu: automatické přidělování slev (např. 10% na díly, 5 % na servisní úkony) vázané na klientský profil.
- Digitalizace příjmu do servisu: nahrávání a ukládání fotodokumentace závad přímo z mobilních zařízení ve vyplnovací formulař.
- Modulární reporting a KPI: systém musí být dynamický a parametrizovatelný, aby lokální management mohl tvořit vlastní sestavy (SQL dotazy) a flexibilně upravovat pravidla pro výpočet odměn bez zásahů do zdrojového kódu.
- Automatizované notifikace (alerty) pro prodejce (např. upozornění na blížící se nákup aut klientem).

b) Použitelnost

- Plně responzivní design uživatelského rozhraní, umožňující efektivní práci jak na stacionárních monitorech, tak na dotykových tabletech(Android 15 verze).
- Oddělená prezentační a samoobslužná vrstva pro zákazníky (rezervace servisu a půjčovny).

- Uživatelské rozhraní pro zaměstnance musí být koncipováno s ohledem na minimalizaci administrativní zátěže (předvyplněné šablony, logický flow), avšak jeho reálné využívání bude zákazníkem vynucováno direktivně.

c) Spolehlivost

- Garantovaná dostupnost systému (SLA) 99 % v běžné pracovní době (8:00-18:00).
- Garantovaná dostupnost 99% mimo pracovní dobu (pro samoobslužné rezervace klientů).
- Automatizované zálohování sjednocené databáze klientů a zamezení ztráty klientské historie napříč 9 pobočkami.

d) Výkon

- Systém musí plynule obsloužit maximální souběžnou zátěž (concurrent users) 40 aktivních interních uživatelů napříč pobočkami.
- Souběžná zátěž v řádu nižších desítek uživatelů na externích zákaznických portálech v reálném čase.
- Doba odezvy pro složité vyhledávací dotazy v interní síti (např. filtrace v CRM nebo generování reportů) nesmí překročit 2 vteřiny.

e) Podporovatelnost

- Kompletní zdokumentování systému (administrátorská a uživatelská dokumentace).
- Servisní smlouva pokrývající režim 24/7 s jasně definovanými reakčními časy.
- Reakční doba (nástup na řešení) u kritických chyb systému maximálně do 30 minut.
- Poskytnutí součinnosti a fyzické přítomnosti dodavatele na pobočkách během úvodní fáze roll-outu.

f) Další nefunkční požadavky

- Systém musí splňovat nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vzhledem ke zpracování klientských dat.
- Striktní správa přístupů a uživatelských oprávnění na základě rolí (např. management, prodejce, nákupčí, přijímací technik).
- Česká lokalizace kompletního uživatelského rozhraní.

G. BUDOUCÍ STAV

G.1) Vize řešení

Informační sjednocení

Nové ICT technologie informačně sjednotily všech 9 poboček prostřednictvím centrálně sdílené databáze . Díky této integraci jsou veškeré procesy standardizovány a relevantní informace jsou dostupné v reálném čase napříč všemi pobočkami.

Standardizovaný prodej a CRM

Obchodník na pobočce v Ostravě se připravuje na schůzku s B2B klientem. V systému okamžitě vidí kompletní historii klienta, včetně servisních zásahů provedených v Praze, a díky evidenci rozpočtových cyklů oslovuje firmu s nabídkou přesně v okamžiku, kdy firma plánuje nákup nových vozů. Zákazník má k dispozici online konfigurátor, jehož výstupy má prodejce předem k dispozici, což zkracuje dobu jednání a zvyšuje šanci na úspěšný prodej.

Moderní a transparentní servis

Při příjezdu zákazníka do servisu přebírá technik vůz s tabletem v ruce. Na základě VIN kódu systém automaticky identifikuje vůz a technickou specifikaci. Technik provádí fotodokumentaci exteriéru, která se ihned páruje k zakázce. Tím eliminujeme spory o skryté vady.


Efektivní plánování

Manažer pobočky již nemusí bojovat s frontami nebo prostoji u servisu sám. Rezervační systém mu poskytne všechny potřebné informace pro lepší plánování kapacit (např. dostupnost techniků a náhradních dílů).

Strategické řízení založené na datech

Vedení společnosti může na pár kliknutí porovnat výkonnost jednotlivých poboček, sledovat spokojenost zákazníků z dotazníků nebo automaticky vypočítat variabilní složku mzdy zaměstnanců na základě jejich reálného výkonu a KPI.

G.2) Strategie naplnění vize řešení

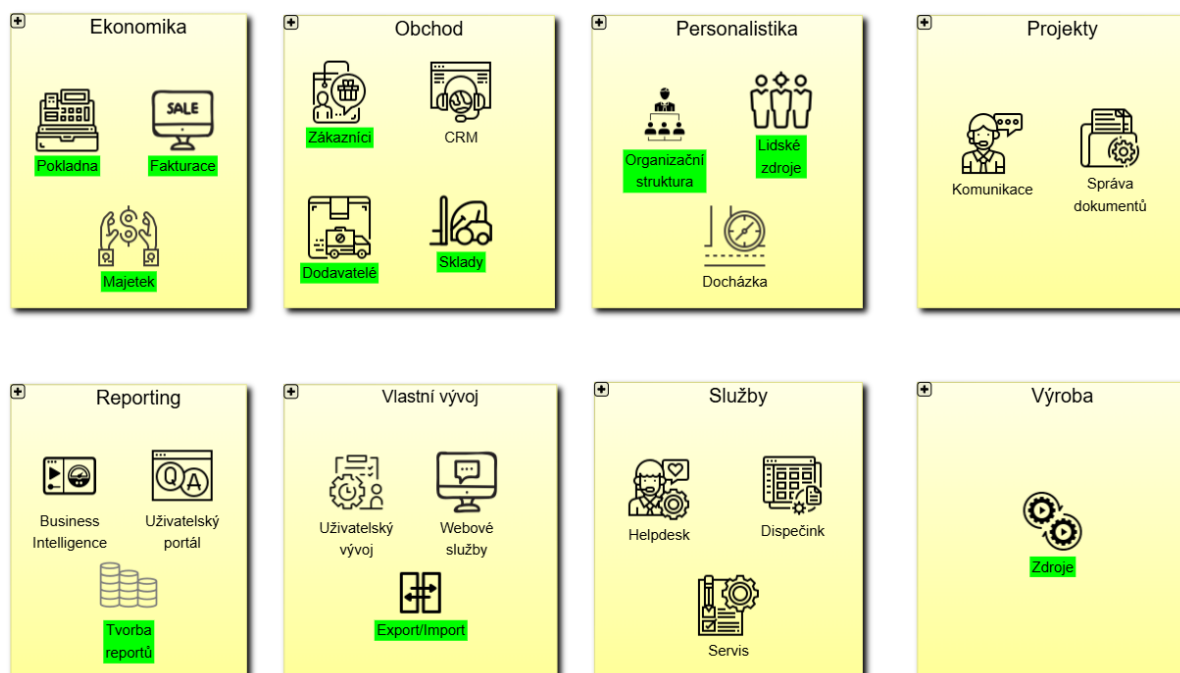

G.3) Přínosy navrženého řešení

Klíčové benefity navrhovaného řešení pro business

- **Zvýšení efektivity:** Díky přesnému plánování kapacit (technici, pracoviště, díly) se očekává zvýšení užitečné vytíženosti servisních pracovišť o 20 % v horizontu dvou let.
- **Sjednocení procesů a dat:** Informační sjednocení 9 poboček zajistí, že data o zákaznících a historii vozů budou dostupná v reálném čase kdekoli v síti, což eliminuje duplicity a chyby
- **Zvýšení prodejního výkonu:** CRM modul umožní obchodníkům sledovat specifické potřeby zákazníků, jako jsou měsíce schvalování firemních rozpočtů u B2B klientů. Tím se předejde odchodu zákazníků ke konkurenci.
- **Zlepšení zákaznické zkušenosti:** Zavedení online konfigurátoru, rezervačního systému a informačních obrazovek v lobby zvýší transparentnost a komfort pro klienty.

- **Sdílení standardizace napříč sítí:** Přestože pobočky zůstávají částečně autonomní, sjednocení informací umožní identifikovat nejúspěšnější procesy na jednotlivých pobočkách a aplikovat je jako standard pro zvýšení efektivity celé společnosti.

Podpora managementu Global cars

Management společnosti získá nástroj pro efektivní řízení a strategické rozhodování založené na tvrdých datech, nikoli na odhadech.

Mezi hlavní přínosy patří:

- **Konsolidovaný reporting:** Okamžitý přehled o prodejních výsledcích a výkonnosti všech poboček bez nutnosti manuálního zpracování fyzických záznamů
- **Objektivní systém odměňování:** Systém umožní automaticky vypočítávat variabilní složku mzdy na základě reálného KPI, jako je počet zakázek nebo spokojenost zákazníků z dotazníků
- **Flexibilita a modularita:** Management může v systému samostatně měnit parametry u reportů podle aktuálních potřeb trhu bez nutnosti zásahu do kódu
- **Monitoring incidentů:** Evidence negativních incidentů umožní vedení včas identifikovat problematické procesy a přijmout nápravná opatření

Klíčové benefity navrhovaného řešení pro IT a provoz

- **Automatizace administrativy:** Systém automatizuje rutinní úkony, jako je generování objednávek náhradních dílů v PDF nebo zasílání CRM alertů pro oslovení klientů
- **Vysoká dostupnost a spolehlivost:** Garantovaný uptime 99,8 % v pracovní době a rychlá odezva systému do 2 vteřin zajistí plynulý chod poboček

- **Standardizace dat:** Zavedení pevných polí v CRM namísto volného textu zajistí vysokou kvalitu a použitelnost dat pro budoucí analýzy

G.4) Rizika navrženého řešení

Zákazníkovy problémy s procesní roztříštěností a využíváním kapacit servisu jsou téměř vždy provázeny riziky, která mohou nastat. Implementace nového centrálního informačního systému vybraná rizika eliminuje, ale na druhou stranu přináší nová. Společně jsme identifikovali následující rizika současného i budoucího stavu. Tato rizika je doporučeno při závěrečném hodnocení vzít jako další parametr rozhodovacího procesu.

Poznámka: Hodnoty pravděpodobnosti vycházejí ze zkušenosti dodavatele studie z podobně fungujících společností v automotive sektoru a z diskuse se zákazníkem.

RZ01 - Nízká efektivita a finanční stagnace (Současný stav)

Stav:	Nastalo
Vlastník:	Global cars, a.s.
Pravděpodobnost výskytu:	100 %
Dopad	• Nevyužitá kapacita autoservisu (aktuální efektivita pouze na 70 %). • Společnost operuje na hraně rentability („kladná nula“). • Nemožnost adekvátně finančně odměňovat klíčové prodejce (hrozba jejich odchodu ke konkurenci). • Ztráta potenciálních B2B zakázek z důvodu nejednotné klientské historie.
Plán pro mitigaci rizika	• Průběžná snaha lokálních manažerů o manuální vytěžování dat. • Motivace stávajících prodejců nefinančními benefity.
Krizový plán	• Urychlené nasazení nového CRM a rezervačního systému (řešeno tímto projektem) pro skokové zvýšení prodeje o 10 % a servisu o 20 %.

RZ02 - Neochota a rezistence zaměstnanců k novému systému

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Global cars, a.s.
Pravděpodobnost výskytu:	30 %
Dopad	- Nízká kvalita dat v novém CRM modulu (zaměstnanci se vrátí k textovým souborům). - Zmaření investice do digitalizace a nedosažení slibovaného ROI. - Pokles prodejů v prvních měsících po nasazení (tzv. uživatelská paralýza).
Plán pro mitigaci rizika	- Jasně deklarovaný autokratický přístup vedení k vynucování evidence dat. - Kvalitní dvoufázové školení a fyzická přítomnost IT konzultantů na všech 9 pobočkách v prvním týdnu ostrého provozu. - Navázání mzdových bonusů a KPI přímo na správné využívání systému.
Krizový plán	Striktní uplatnění personálních kroků - výměna a nahrazení těch zaměstnanců, kteří se novému systému nepřizpůsobí.

RZ03 - Nedostupnost cloudového řešení po nasazení

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Enterprise Solutions, s.r.o. / Global cars, a.s.
Pravděpodobnost výskytu:	5 %
Dopad	- Nedostupnost informací o rezervacích a klientské historii napříč všemi 9 pobočkami. - Neschopnost přijímat vozidla do servisu (tvorba front na pobočkách). - Zhoršení pověsti společnosti a ztráta zákazníků.
Plán pro mitigaci rizika	- Varianta 1 (Chyba dodavatele SaaS): Přenesení rizika na dodavatele prostřednictvím smlouvy o podpoře. Striktní definice SLA s dostupností 99 % v pracovní době a reakční dobou na kritické chyby do 30 minut. - Varianta 2 (Chyba na pobočce): Zajištění záložního (např. 5G/LTE) internetového připojení na všech pobočkách ze strany zákazníka.

Krizový plán	• Uplatnění tvrdých finančních sankcí vůči dodavateli řešení. • Aktivace nouzového režimu (zpracování příjmů do servisu „papírovou“ metodou dle předem připraveného krizového manuálu) a pozdější ruční přepis dat do systému po obnovení spojení.
--------------	---

RZ04 - Nekvalitní nebo chybějící historická data při spuštění (Big Bang)

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Global cars, a.s.
Pravděpodobnost výskytu:	15 %
Dopad	• Po lednovém spuštění systému nebudou v CRM dostupná správná data o zárukách a B2B klientech z minulosti. • Nemožnost spustit věrnostní program a slevy na náhradní díly hned od prvního dne. • Zmatky v účetnictví na začátku nového fiskálního roku.
Plán pro mitigaci rizika	• Aplikace strategie Read-only instance(starý systém zůstane na pobočkách dostupný pouze pro čtení pro dohledávání starých záruk). • Provedení důkladné účetní uzávěrky a fyzické inventury před termínem Go-Live (10. ledna 2027).
Krizový plán	• Jednání s dodavatelem o hromadných automatizovaných opravách databáze (skriptem) na základě zjištěných anomálií po spuštění. • Manuální dočišťování kritických B2B klientských profilů asistentkami na pobočkách v průběhu prvních měsíců ostrého provozu.

H. Roadmapa projektu

H.1) Projektový tým

S ohledem na důležitost nového informačního systému (CRM, rezervační modul a nový web), který se po nasazení stane klíčovým systémem společnosti Global cars, a.s., je nezbytné pro implementaci vytvořit odpovídající organizační strukturu. Ta bude zajišťovat komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem, operativní i strategické řízení projektu. Tým se skládá z následujících rolí:

- **Řídící komise** - nejvyšší projektová řídicí struktura projektu. Schvaluje a koordinuje klíčové plánované dodávky a milníky. Je nadřízená Projektovému řízení. Členi jsou nominováni z vrcholového managementu Global cars, a.s. a Enterprise Solutions, s.r.o. Jedná se o dozorný orgán nad projektem. V rámci projektu se ze strany Global cars očekává účast majitele společnosti a projektového manažera (Ing. Jan Kočí).
- **Projektový tým za Global cars, a.s.**
 - **Projektový manažer (zástupce vedení)**- má rozhodovací pravomoc a je odpovědný za řízení pracovníků Global cars v rámci projektu. Specifikuje požadavky na funkcionalitu a provádí průběžnou akceptaci.
 - **Klíčový uživatel systému**- zkušení zaměstnanci (např. vedoucí servisů, seniorní obchodníci), kteří detailně znají firemní procesy, definují požadavky pro Business analytika a účastní se testování.
 - **Běžný uživatel systému**- vybraní zaměstnanci (přijímací technici, řadoví prodejci), kteří jsou zapojeni do testování a ověřování uživatelské přívětivosti. Nemají rozhodovací pravomoc.
- **Projektový tým za Enterprise Solutions, s.r.o.** - je odpovědný za dodání výstupů ve stanovených termínech a kvalitě. V rámci projektu se využívají následující role:
 - **Projektový manažer (Mykhailo Plokhin)** - je odpovědný za koordinaci týmu, kontrolu součinnosti zákazníka a projektová rizika.
 - **Vedoucí analytik (Ivan Shestachenko)** - osoba odpovědná za mapování procesů, přípravu a vedení jednání se zákazníkem, vedení prezentací, kontrolu výstupů podřízených analytiků v týmu.
 - **Business analytik (Yernur Bauyrzhanuly)** - osoba odpovědná za analýzu byznys požadavků zákazníka a vytvoření UI/UX prototypu rozhraní.
 - **Systémový analytik (Daniil Sofin)** - osoba odpovědná za návrh systémové architektury, zpracování Business Model Canvas (BMC) a správu repozitáře.

- **IT Konzultanti / Podpora** - osoby zajišťující školení uživatelů a bezprostřední fyzickou asistenci na pobočkách v prvním týdnu po nasazení systému do ostrého provozu.

Činnosti rolí Enterprise Solutions, s.r.o. se budou v rámci projektu navzájem prolínat a v případě potřeby se do projektu, po dohodě s Global cars, a.s., mohou zapojit další pracovníci a IT konzultanti (např. pro zajištění fyzické podpory na všech 9 pobočkách v prvním týdnu po spuštění).

H.2) Součinnosti

Součinnost, kterou je v rámci implementace nového systému ze strany Global cars, a.s. nutné poskytnout dodavateli (Enterprise Solutions, s.r.o.), lze rozdělit na 3 typy: Zdroje, Projekty a Infrastruktura.

Zdroje

Jedná se o konkrétní součinnost jednotlivých členů projektového týmu zákazníka. Především je nutné provést následující aktivity:

- **Projektový manažer** - stanovení kompetentního zástupce, zajištění koordinace dovnitř firmy (zejména v kritických měsících s výjimkou tzv. Blackouts v prosinci a v létě, kdy součinnost nebude možná).
- **Klíčoví a běžní uživatelé** - zajistit jejich dostatečnou kapacitu pro analytické schůzky. Zákazník navíc vyčlení zaměstnance jedné pobočky pro měsíční pilotní a paralelní provoz (v listopadu/prosinci) k odladění procesů. Na začátku ledna 2027 musí uvolnit všechny zaměstnance na plošné centrální školení.
- **Testeři** - poskytnutí uživatelů pro uživatelské akceptační testy (UAT).
- **Členové řídicí komise** - pravidelná účast na klíčových schůzkách (např. finální schválení designu, odsouhlasení rozpočtu).

Projekty a okolní systémy

Ve společnosti v současné době neprobíhá žádný souběžný projekt s výjimkou kompletní tvorby zcela nového webu (od nuly). Nový informační systém do něj musí být plně integrován (včetně klientské zóny po přihlášení a rezervačního formuláře).

Pro radikální zjednodušení datové migrace zákazník zajistí, že na všech 9 pobočkách zůstane k termínu nasazení "zmrazená" (read-only) kopie starého systému pro dohledávání starých záruk a klientské historie. Zabrání se tak přenosu chybových transakcí.

Infrastruktura

Společnost Global cars, a.s. se v rámci transformace zbavuje vlastního lokálního IT personálu, proto plnou správu systému a cloudové infrastruktury zajistí formou SLA smlouvy (24/7) dodavatel. Od zákazníka je vyžadováno pouze následující:

- Garantování fyzické připravenosti a provozuschopnosti stávajících stacionárních počítačů (požadavek: OS Windows, procesory AMD/Intel, min. 16 GB RAM) na všech pobočkách.
- Zajištění 10" tabletů(Android 15 verze) nebo mobilních telefonů s fotoaparátem pro přijímací techniky na pobočkách pro potřeby fotodokumentace.
- Zajištění dostatečně stabilního a propustného připojení k internetu pro komunikaci s cloudovým webovým klientem.

H.3) Etapa 1

H.4) Vize dalšího rozvoje systému

V současné době je prioritou úspěšně dokončit pilotní provoz a zajistit plošné nasazení (Go-Live) celého nového řešení do fixně stanoveného termínu cca 10. ledna 2027. Z toho důvodu je předčasné detailně plánovat obsah a zaměření dalšího rozvoje systému nad rámec aktuálně sjednaného rozsahu. Jednou z možností budoucího rozvoje je plná elektronická integrace (API) s lokálními dodavateli náhradních dílů. Tato funkcionality byla v aktuální fázi odložena z důvodu technologické nepřipravenosti na straně dodavatelů (systém bude zatím generovat objednávky do PDF a odesílat je e-mailem). Další případnou nadstavbou by mohla být detailní skladová evidence veškerého drobného spotřebního materiálu (např. přesná evidence spotřeby specifických typů olejů), od které zákazník v první fázi vědomě upustil ve prospěch stávajícího řešení fyzických visaček. Jednalo by se v

tuto chvíli o zbytečnou investici a administrativní zátěž, která by mohla ohrozit stanovený termín dokončení implementace a zkomplikovat úvodní fázi adopce systému ze strany zaměstnanců. Během analýzy nebyly identifikovány žádné další kritické funkčnosti, které by bylo nutné do systému bezprostředně po ostrém startu implementovat. Společnost Enterprise Solutions, s.r.o. však na základě svých zkušeností doporučuje společnosti Global cars, a.s., aby po prvním roce reálného provozu provedla komplexní zpětné vyhodnocení funkčnosti a celkového přínosu systému. Následně bude v rámci tohoto vyhodnocení možné rozhodnout o:

- dodatečné úpravě a fixaci pravidel pro výpočet odměňovacích metrik (KPI), které se budou v prvních fázích po nasazení ladit za pochodu,
- případném dalším rozšíření funkcionalit na základě reálných zkušeností a zpětné vazby uživatelů na pobočkách.

H.6) Podpora systému po nasazení

H.7) Projektová rizika

Projektová rizika, uvedená v této kapitole, odpovídají nejčastějším rizikům, která se při realizaci informačních systémů objevují a která byla identifikována během analytických jednání mezi dodavatelem (Enterprise Solutions, s.r.o.) a zákazníkem (Global cars, a.s.).

Poznámka: Hodnoty pravděpodobnosti vycházejí ze zkušenosti dodavatele studie, specifík autonomního fungování S poboček zákazníka a diskuse nad kapacitními omezeními

RP01 - Nasazení systému po plánovaném termínu (10. ledna 2027)

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Global cars, a.s. / Enterprise Solutions, s.r.o.
Pravděpodobnost výskytu:	20 %
Dopad	• Nedodržení fixního termínu ostrého startu (Go-Live) a narušení návaznosti na účetní uzávěrku. • Prodloužení status quo (procesní roztříštěnost). • Finanční ztráty z důvodu opožděného náběhu optimalizovaných procesů.

	Hrozba uplatnění vysokých smluvních sankcí vůči dodavateli.
Plán pro mitigaci rizika	- Důsledné naplánování iterativního přístupu: analytické práce v červnu, pilotní provoz v listopadu 2026. - Plánování veškerých akceptací mimo nahlášená období provozních špiček a dovolených zákazníka (červenec, srpen, prosinec). - Průběžné a transparentní reportování stavu projektu na řídicí komisi.
Krizový plán	- Zvýšené úsilí a nasazení dodatečných kapacit projektového týmu. - Svolání řídicí komise a diskuse o omezení rozsahu nasazované funkcionality (změna „trojimperativu“) ve prospěch udržení termínu.

RP02 - Nedostatečná kapacita týmu při plošném roll-outu

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Enterprise Solutions, s.r.o.
Pravděpodobnost výskytu:	15 %
Dopad	- Dopad na kvalitu podpory uživatelů v kritickém prvním týdnu ostrého provozu. - Zmatek při zavádění nových procesů do praxe na 9 pobočkách současně. - Ohrožení garancí plynoucích ze servisní smlouvy (SLA).
Plán pro mitigaci rizika	- Včasné alokování dostatečného množství IT konzultantů (odhadem 45 MDs pro první týden) s adekvátním mixem juniorních a seniorních expertů. - Vytvoření detailního harmonogramu výjezdů na pobočky v předstihu.
Krizový plán	Okamžité nasazení externích subdodavatelských kapacit na podporu uživatelů.

	Krizová prioritizace fyzické podpory pouze na pobočky s největším objemem zákazníků (např. Praha, Ostrava).
--	---

RP03 - Nedostatečná součinnost zákazníka

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Global cars, a.s.
Pravděpodobnost výskytu:	25 %
Dopad	- Dopad na kvalitu a termín dodání výstupů projektu (nemožnost uzavřít analytickou fázi včas). - Chybějící klíčová data pro testování. - Frustrace členů projektového týmu.
Plán pro mitigaci rizika	- Včasná eskalace problému na nejvyšší vedení s využitím jeho deklarovaného autokratického přístupu. - Striktní dodržování domluveného projektového harmonogramu s ohledem na nahlášené blackout (výpadky kapacit na straně Global cars).
Krizový plán	- Dohoda se zákazníkem o posunu termínu pilotního provozu. - Svolání řídicí komise, která vyvodí důsledky směrem k nekomunikujícím manažerům lokálních poboček.

RP04 - Problémy s integrací a datovou migrací

Stav:	Potenciální
Vlastník:	Enterprise Solutions, s.r.o.
Pravděpodobnost výskytu:	15 %
Dopad	- Neschopnost naplnit jednotnou databázi validními daty ze starých systémů (textových souborů). - Znehodnocení CRM modulu historickým „balastem“. - Nemožnost správně nastavit věrnostní program pro stávající B2B klienty.

Finanční analýza za období implementace a následujících pěti let provozu						
Použitá diskontní sazba:	6%					
Rok	0	1	2	3	4	5
Licence	-1,390,000 Kč					
Etapa 1	-10,036,000 Kč					
Etapa 2	0 Kč					
Ostatní náklady	-10,000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Maintenance		0 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč	-278,000 Kč
Podpora		-200,000 Kč	-200,000 Kč	-200,000 Kč	-200,000 Kč	-200,000 Kč
Úspory		4,500,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč	9,800,000 Kč
CF	-11,436,000 Kč	4,300,000 Kč	9,322,000 Kč	9,322,000 Kč	9,322,000 Kč	9,322,000 Kč
DCF	-11,436,000 Kč	4,056,604 Kč	8,296,547 Kč	7,826,931 Kč	7,383,897 Kč	6,965,941 Kč
Náklady celkem (za 5 let)						13,548,000 Kč
Úspory celkem (za 5 let)						43,700,000 Kč
NPV						23,093,919.36 Kč
ROI*						223%

(bez započítání diskontu)

(za dobu pěti let provozu systému)

* ROI = ((úspory celkem - náklady celkem)/náklady celkem)*100

L22		=L15*L16*L21-(L15*L16)			
	H	I	J	K	L
4					
5				Obrat autoprodeje (Kč)	300000000
6				Ziskovost autoprodeje	8%
7					
8				Zvýšení obratu autoprodeje 1. rok po spuštění	110%
9				Úspory v autoprodeji 1. rok po spuštění (Kč)	2400000
10					
11				Zvýšení obratu autoprodeje 2. rok po spuštění	120%
12				Úspory v autoprodeji 2. rok po spuštění (Kč)	4800000
13					
14					
15	(bez započítání diskontu)			Obrat autoservisu (Kč)	70000000
16				Ziskovost autoservisu	30%
17					
18	(za dobu pěti let provozu systému)			Zvýšení obratu autoservisu 1. rok po spuštění	110%
19				Úspory v autoservisu 1. rok po spuštění (Kč)	2100000
20					
21				Zvýšení obratu autoservisu 2. - 5. rok po spuštění	120%
22				Úspory v autoservisu 2. - 5. rok po spuštění (Kč)	4200000
23					
24					
25				Roční úspory na náboru nových zaměstnanců 2. - 5. rok po spuštění (Kč)	800000
26					
27					
28				Celkové úspory 1. rok po spuštění (Kč)	4500000
29				Celkové úspory 2. - 5. rok po spuštění (Kč)	9800000
30					

J. ZÁVĚR

Tento dokument úvodní studie vznikl na základě potřeby společnosti Global cars, a.s. sjednotit vnitřní procesy a zajistit moderní ICT podporu prodeje a servisu napříč svými 9 doposud autonomními pobočkami. Obsahuje analýzu aktuálního stavu situace ve společnosti (absence CRM, manuální rezervace, roztříštěnost postupů), návrh vhodného technologického řešení a definici projektu spojeného s jeho implementací a nasazením. V rámci definovaného projektu je reflektováno dodržení klíčových termínů, zejména zahájení pilotního provozu v listopadu 2026 a plného nasazení (Go-Live) k 10. lednu 2027. V závěru je provedeno vyhodnocení předpokládané návratnosti investice (ROI). Společnost Global cars díky této studii získala podklady pro rozhodnutí, zda navržené řešení implementovat a modernizovat tak své podnikání v souladu s aktuálními trendy.

Při tvorbě dokumentu byly zvažovány různé varianty řešení tak, aby byly v souladu s firemní strategií maximalizace využitosti zdrojů bez zbytečných časových rezerv. Nakonec bylo zvoleno cloudové řešení postavené na dynamickém a parametrizovatelném modulu CRM a online rezervačním systému, doplněném o digitalizaci příjmu prostřednictvím mobilních terminálů (tabletů Android 15 verze). Očekávané přínosy řešení- zvýšení prodeje vozů o 10 % a servisní kapacity o 20 % - představují potenciál dodatečného ročního obrátu ve výši přes 44 milionů Kč. S ohledem na tyto skutečnosti a přiměřené investiční i provozní náklady je využití navrženého řešení z pohledu Global cars, a.s. vysoce výhodné a zaručuje rychlou návratnost.

Před implementací je nutné si uvědomit, že ze strany Global cars je nezbytné poskytnout odpovídající součinnost. Klíčová bude zejména plná a autokratická podpora ze strany nejvyššího vedení při prosazování nového systému do praxe a překonávání počáteční rezistence zaměstnanců. Dále je nutné vyhradit interní kapacity pro pilotní testování a plošná školení zaměstnanců před samotným spuštěním, včetně zajištění kooperace při fyzické přítomnosti IT konzultantů na všech 9 pobočkách v prvním týdnu ostrého provozu.

Na závěr studie lze konstatovat, že hlavní cíl, kterým bylo navrhnout řešení pro informační a procesní sjednocení společnosti Global cars, byl plně naplněn. Vedlejším cílem práce na studii bylo ukázat schopnosti společnosti Enterprise Solutions, s.r.o. jako spolehlivého dodavatele a integrátora inovativních IT řešení. Věříme, že kvalita odvedené práce a tohoto dokumentu jsou začátkem úspěšné a dlouhodobé spolupráce. S ohledem na striktní časový harmonogram, nutnost zahájit analytické práce již 1. června 2026 a definovaná

období provozních výpadků na straně zákazníka, doporučuje dodavatel společnosti Global cars, aby o zahájení implementace rozhodla co nejdříve po akceptaci této úvodní studie.
